INFORME DETALLADO · MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

Cómo recibe usted el presupuesto municipal

Lo que muestran los datos públicos del presupuesto 2023–2026, explicado para quien asumirá la alcaldía en enero.

Datos del MEF al 11/11/2026 · las cifras de 2026 son parciales

Antes de leer. Todo sale de lo que el MEF publica: presupuesto, gasto registrado (devengado) e ingresos registrados. Esos datos no muestran el avance físico de las obras, los contratos, el dinero en cuentas ni las deudas no registradas. Por eso aquí se separan los datos de las señales que conviene revisar; la última sección dice qué pedir.

1. Qué presupuesto hay y cuánto se ha ejecutado

AÑO	PIA	PIM	DEVENGADO	DEVENGADO ÷ PIM	NO DEVENGADO
2023	S/ 17.8 M	S/ 28.1 M	S/ 19.4 M	69.2 %	S/ 8.7 M
2024	S/ 25.8 M	S/ 31.7 M	S/ 25.9 M	81.5 %	S/ 5.9 M
2025	S/ 21.8 M	S/ 35.5 M	S/ 31.8 M	89.5 %	S/ 3.7 M
2026*	S/ 22.3 M	S/ 27.6 M	S/ 13.6 M	49.4 %	S/ 14.0 M

PIA: presupuesto de apertura · PIM: presupuesto modificado (final en 2023–2025, vigente en 2026) · Devengado: obligación de pago reconocida. *2026 al 11/11/2026.

En 2026 el presupuesto (PIM) es S/ 27.6 M: S/ 5.4 M más que al inicio del año (+24 %). Pero es menor que en los dos años anteriores: S/ 31.7 M en 2024 y S/ 35.5 M en 2025. Que un monto esté en el PIM no significa que el dinero haya llegado. En 2023–2025 gastó en promedio el 80.1 % de su presupuesto final. Cada año quedaron sin gastar unos S/ 6.1 millones.

Qué significa para usted. Recibe un presupuesto más chico que el de 2025. Antes de prometer obras nuevas, conviene saber cuánto del PIA 2027 ya está comprometido.

2. Frente a los mismos meses de años anteriores


A fin de octubre de 2026 había gastado el **48.4 %** de su presupuesto. A la misma fecha de 2023–2025, el promedio fue **67.3 %** (54.8 %, 63.8 % y 83.2 %). Visto así, 2026 es el año que menos avanza. Pero parte del presupuesto es canon que no llegará (sección 5). Si se quita ese dinero de la cuenta, 2026 avanza algo más que 2023, aunque sigue muy por detrás de 2025, el año que más avanzó.

Frente a las demás municipalidades distritales de la provincia de Zarumilla, a la misma fecha:

MUNICIPALIDAD	DEVENGADO ÷ PIM A FIN DE OCTUBRE	PROMEDIO 2023–2025
MD Papayal	83.4 %	72.5 %
MD Matapalo	60.5 %	85.9 %
MD Aguas Verdes	48.4 %	80.1 %

Fuente: MEF, Datos Abiertos, mismo archivo para todas. Comparar no explica las causas.

Devengado acumulado como % del PIM, mes a mes

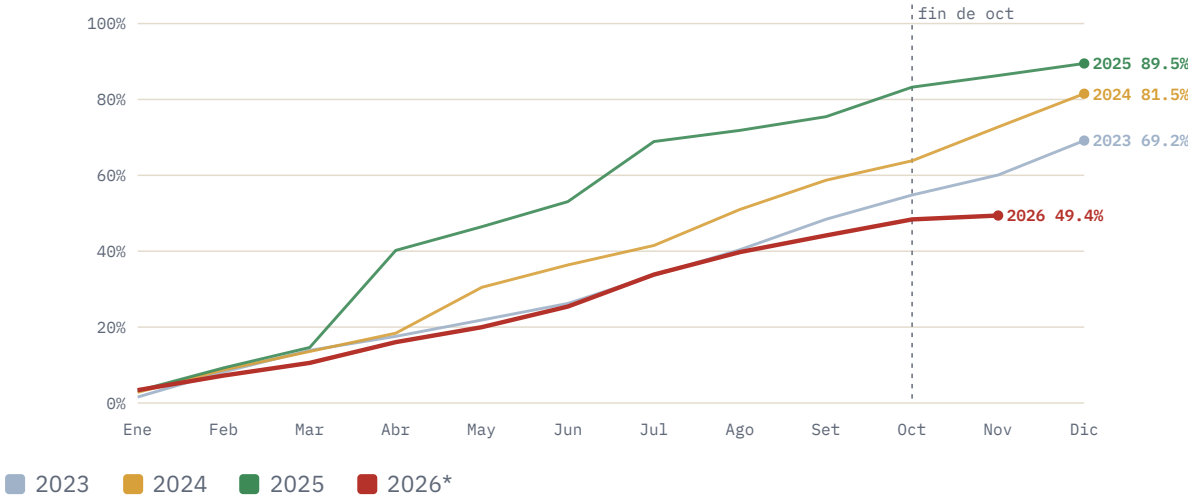

Fuente: MEF, Datos Abiertos. Años cerrados sobre su PIM final (comparación retrospectiva); 2026 sobre el PIM vigente.

Al 11/11/2026 va en 49.4 %. Si se gastara lo mismo cada día, llevaría 86.3 %; es solo una referencia, no una meta ni una programación oficial.

> **Qué significa para usted.** 2026 se frenó: si nada cambia, la gestión saliente cerraría con más saldo sin gastar que en los años anteriores. Pida desde enero una programación mensual de gasto y de obras, y revísela cada mes.

3. Dónde se concentra el saldo

Faltan gastar S/ 14.0 M. De eso, S/ 8.7 M (62 %) son obras y equipos (genérica 2.6), que avanzan 30.2 %. A sus 20 proyectos les falta gastar S/ 8.5 M, y cinco concentran S/ 7.3 M (86 %). El mayor saldo es la obra de seguridad ciudadana, pagada con CIPRL y sin dinero reservado al corte. Ninguno de los cinco es de prevención ante lluvias:

PROYECTO	PIM 2026	DEVENGADO ÷ PIM 2026	SALDO	OBRA AVANZADA (DECLARADO)
Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana local en municipalidad distrital de Aguas Verdes distrito de Aguas Verdes de la provincia de zarumilla del departamento de tumbes CUI 2621453	S/ 3.3 M	0.0 %	S/ 3.3 M	96 % (gastado: 80 %)
Creacion del servicio de practica deportiva y/o recreativa en el polideportivo de la i etapa del aa.hh villa primavera distrito de Aguas Verdes - provincia de zarumilla - departamento de tumbes CUI 2612068	S/ 2.2 M	12.4 %	S/ 2.0 M	sin registro
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial y peatonal en el aa.hh. complejo habitacional, distrito de Aguas Verdes, provincia de zarumilla - tumbes CUI 2398234	S/ 1.0 M	0.0 %	S/ 1.0 M	50 % (gastado: 50 %)
Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el asentamiento humano ampliacion alberto fujimori fujimori del distrito de Aguas Verdes de la provincia de zarumilla del departamento de tumbes CUI 2704664	S/ 2.0 M	62.6 %	S/ 0.7 M	70 % (gastado: 69 %)
Construccion de pavimento y veredas asentamiento humano nuevo Aguas Verdes, distrito de Aguas Verdes - zarumilla - tumbes CUI 2087247	S/ 1.6 M	76.5 %	S/ 0.4 M	56 % (gastado: 88 %)

Obra avanzada: la declara la municipalidad en el Formato N.° 12-B del MEF (al 12/11/2026). Entre paréntesis, lo gastado de su costo total en todos los años.

El porcentaje es avance financiero del año, no avance físico; un 0 % no prueba que la obra no haya empezado. El PIM anual no es el costo total del proyecto.

El 72.6 % del presupuesto ya está certificado, es decir, reservado para gastarse este año (art. 41.1 del D. Leg. 1440). Lo que un contrato deba pagar en 2027 o después necesita una previsión presupuestaria (art. 41.4). Esa previsión debe ajustarse a la programación multianual y a lo que se puede financiar (Oficio Circular N.° 0035-2026-EF/50.07). Hay S/ 5.1 M reservados que todavía no tienen un contrato registrado. El mayor monto (S/ 1.8 millones) está en el polideportivo de Villa Primavera. El dato no dice si hay contratos o procesos en marcha: hay que preguntarlo.

> **Qué significa para usted.** Estos proyectos marcarán su primer mes. Para decidir si siguen, se reprograman o se revisan, necesitará el expediente, el contrato y el avance físico de cada uno. En la seguridad ciudadana, además, el convenio de Obras por Impuestos.

4. Cómo cambian los ingresos

En el PIM 2026 pesan: canon y sobrecanon 54 %, FONCOMUN 22 %, operaciones de crédito 12 %, recursos directamente recaudados 6 %, impuestos municipales 4 %, recursos ordinarios 1 %, donaciones y transferencias 1 %. Los recursos propios son solo el 10 % del PIM. Lo que entró de enero a octubre de cada año (sin saldos de balance):

- **Canon y sobrecanon:** S/ 6.3 M, 23 % menos que en 2025 y 41 % menos que en 2023. Es la principal fuente de la municipalidad y la que más cae.
- **Ingresos propios:** S/ 1.4 M, 25 % menos que en 2025. Predial: S/ 0.5 M (2025: S/ 0.7 M).
- **FONCOMUN:** S/ 5.0 M, 30 % más que en 2025; compensa solo en parte la caída del canon.

Los créditos suman S/ 3.3 M en el presupuesto: todo son CIPRL para la obra de seguridad ciudadana, y aún no se ha gastado nada.

Saldo de balance (dinero de años anteriores que no se gastó): en 2026 se presupuestaron S/ 3.2 M, pero solo figuran registrados S/ 0.3 M. Tesorería debe explicarlo. En 2024 se registraron S/ 8.3 M y en 2025, S/ 2.7 M. Desde 2025 la municipalidad tiene mucho menos dinero guardado. Cuánto hay de verdad solo lo dicen los saldos bancarios. (Diferencia entre lo presupuestado y lo registrado: 2023: S/ 1.0 M; 2024: S/ 0.9 M; 2025: S/ 0.0 M.)

> **Qué significa para usted.** El canon, su principal ingreso, viene cayendo y además paga los CIPRL. No asuma gasto permanente contando con que se recupere, y verifique que las previsiones financiadas con canon usen su proyección real.

5. Escenarios de cierre 2026

ESCENARIO	EJECUCIÓN AL CIERRE	SIN DEVENGAR
Menor ejecución	49.7 %	S/ 13.9 M
Central	**61.5 %**	**S/ 10.6 M**
Mayor ejecución	78.5 %	S/ 5.9 M

Cómo se calcula cada escenario: ver el anexo al final.

Si noviembre y diciembre se parecen a 2023–2025, el año cerraría en **61.5 %**. Quedarían **S/ 10.6 millones** sin gastar, casi el doble del promedio de esos años (S/ 6.1 millones). El rango de referencia va de 49.7 % a 78.5 %. Son escenarios, no pronósticos, y suponen que el PIM no cambia. Para gastar todo el PIM harían falta S/ 8.5 M por mes, frente a un promedio mensual de S/ 1.3 M en el año.

Prueba con años pasados. Si este método se hubiera usado a fin de octubre, habría anticipado 78.2 % para 2024 (cerró en 81.5 %) y 95.5 % para 2025 (cerró en 89.5 %). Se habría equivocado en 3.3 y 6.0 puntos. El cierre real quedó fuera del rango en 1 de 2 casos. Los escenarios son referencias, no límites.

¿Saldo real o presupuesto sin sincerar? El MEF estimó para 2026 S/ 8.1 M de canon y sobrecanon (Comunicado N.° 0018-2026-EF/50.01, 27/10/2026); el PIM mantiene S/ 11.9 M. En total, unos **S/ 4.8 M** del presupuesto 2026 no llegarían este año. Es el 45 % del saldo sin gastar del escenario central. Esa parte no es dinero sin gastar: es presupuesto que no se ajustó a los ingresos reales. Además, S/ 2.9 M de saldo de balance presupuestado aún no figuran como ingreso registrado. La diferencia crece cada año. Lo que quedó sin recaudar al cierre fue 2023: S/ 0.1 M; 2024: S/ 2.2 M; 2025: S/ 3.5 M. Si se quita ese dinero de la cuenta, a fin de octubre de 2026 se habría gastado 58 de cada 100 soles (92 en 2025, con el mismo ajuste). La Ley 32732 permitió reducir el presupuesto con las estimaciones del MEF. Conviene revisar el presupuesto actual y preparar el de 2027 con esas estimaciones.

Qué significa para usted. En el escenario central quedarían unos S/ 10.6 millones sin devengar. Una parte podría volver en 2027 como saldo de balance, pero solo si el dinero está en las cuentas. El canon que no llegue no volverá. Confírmelo con Tesorería.

6. Deuda y margen para pagar

AÑO	DEUDA TOTAL	FRENTE AL LÍMITE	INGRESO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	AHORRO EN CTA. CTE.
2023	S/ 4.5 M	13 %	S/ 20.4 M	S/ 13.2 M	S/ 7.2 M
2024	S/ 3.1 M	8 %	S/ 20.2 M	S/ 12.5 M	S/ 7.7 M
2025	S/ 17.7 M	52 %	S/ 16.8 M	S/ 11.9 M	S/ 4.9 M
2026*	S/ 18.4 M	58 %	S/ 5.0 M	S/ 5.7 M	S/ -0.7 M

Fuente: MEF, informes de reglas fiscales de gobiernos locales (evaluación anual 2023–2025; 2026* = seguimiento 2T2026). La deuda total no incluye beneficios sociales, pensiones ni juicios.

Según los informes anuales del MEF, la municipalidad cumplió las dos reglas fiscales en 2023, 2024 y 2025. Pero su deuda total saltó de S/ 3.1 millones en 2024 a S/ 17.7 millones en 2025. Equivale al 52 % de sus ingresos corrientes promedio; el límite es 100 %. El registro de deuda del MEF (DGTP) muestra S/ 13.9 M al 31/05/2026, en dos créditos por CIPRL que se pagan con descuentos sobre el canon. Eso explicaría la mayor parte del salto (hipótesis, porque las fechas no coinciden). Con deudas a marzo de 2026, la deuda llega a S/ 18.4 millones (58 %). Además, no cumple la regla de ahorro: el gasto corriente superó al ingreso corriente (–S/ 0.7 millones). El resultado anual se conocerá con la evaluación de 2026. Mientras tanto, el ingreso corriente bajó de S/ 20.4 millones en 2023 a S/ 16.8 millones en 2025.

Qué significa para usted. Cumple la regla de deuda, pero la mayor parte son CIPRL que se descuentan del canon. Y en el primer semestre de 2026 gastó en lo corriente más de lo que ingresó. Deje constancia en el acta y pida el cronograma de descuentos.

7. El condicionante de las lluvias

Hay que separar cuatro cosas. El **fenómeno**: el ENFEN (comunicado N.° 19-2026, 30/10/2026) prevé un Niño costero extraordinario hasta febrero de 2027, medido por la temperatura del mar. Las **lluvias**: se pronostican sobre lo normal en la costa norte, sin un pronóstico específico para el distrito. La **emergencia**: Aguas Verdes ha pasado 2026 bajo declaratorias por lluvias, una tras otra. La primera fue la de enero (D.S. N.° 005-2026-PCM). La vigente es el D.S. N.° 149-2026-PCM (03/11/2026, 60 días, nivel 4), que vence alrededor del 1 de enero de 2027. Los **daños**: el 1 y 2 de noviembre el río Zarumilla se desbordó, se inundó el A.H. Puerto Perú y se instalaron albergues. La partida de emergencia (5006144) tiene S/ 1.2 M en 2026, todo con canon. Ya gastó S/ 0.9 M, sobre todo en abril. Quedan S/ 0.3 M para el resto del año. La preparación sin esa actividad tiene S/ 0.1 M y los kits de ayuda humanitaria, nada.

Qué significa para usted. Llegará en plena temporada de lluvias. Sin declaratoria vigente, daños en el SINPAD y partida de emergencia en el PIA 2027, no podrá pagar la respuesta a tiempo.

8. Lo que estos datos no permiten saber y qué pedir

SEÑAL EN LOS DATOS	QUÉ PEDIR (RESPONSABLE PROPUESTO)	PRODUCTO VERIFICABLE
Saldo no devengado y saldo de balance	Saldos bancarios por fuente y conciliaciones (Tesorería y Contabilidad)	Conciliación al 31/12/2026
Proyectos con bajo avance financiero	Avance físico, valorizaciones y estado contractual (Obras)	Ficha por CUI con avance físico
Certificado no comprometido (S/ 5.1 M)	Estado de cada certificación (Abastecimiento)	Relación de certificaciones con su situación
Obras por Impuestos de la seguridad ciudadana	Convenio, empresa, plazo, avance y CIPRL emitidos (Gerencia Municipal y Presupuesto)	Expediente del convenio
Deuda de S/ 17.7 M, de la que S/ 13.9 M son CIPRL	Estados financieros con notas; composición de la deuda usada en la regla fiscal; cronograma de descuentos de los CIPRL (Contabilidad, Presupuesto, DGTP)	Inventario de obligaciones con acreedor, monto y vencimiento
Contingencias	Sentencias en ejecución, beneficios sociales y pensiones (Procuraduría y RR. HH.)	Relación con montos y fechas
Emergencia por lluvias	Decretos vigentes y su anexo, plan ante lluvias, daños de noviembre registrados en el SINPAD y requisitos FONDES (Gestión del Riesgo)	Vigencia confirmada; plan aprobado
Presupuesto 2027	PIA 2027 aprobado frente al PIA 2026 (S/ 22.3 M) y previsiones presupuestarias emitidas: CUI, monto y fuente (Presupuesto)	PIA 2027 por fuente y genérica; relación de previsiones

Anexo. Cómo se calcularon los escenarios de cierre 2026

MÉTODO (LOS 1 A 4 SE PROMEDIAN)	VALOR APLICADO	RESULTADO
1. Factor de cierre	×1.205 (promedio de ×1.262, ×1.277, ×1.075) sobre S/ 13.4 M	S/ 16.1 M
2. Gasto nov–dic como % del PIM	12.8 % × S/ 27.6 M	S/ 16.9 M
3. Gasto nov–dic como % de lo que faltaba	39.3 % × (PIM – devengado)	S/ 19.0 M
4. Ritmo de los tres últimos meses	S/ 1.3 M × 2	S/ 16.0 M
Escenario central	promedio de 1 a 4: 61.5 % del PIM	**S/ 17.0 M**
Rango de referencia	central -22.9 % / +32.8 % de lo que falta devengar: 49.7 % / 78.5 %	S/ 13.7 M / S/ 21.7 M

Cómo se calculó. Devengado ÷ PIM con el PIM vigente (2026) o final (años cerrados); referencia lineal = días transcurridos ÷ 365. El escenario central promedia cuatro métodos: fue el que menos se equivocó al probarlo en unas 1 900 municipalidades (2024–2025). El rango usa los percentiles 10 y 90 de esos errores. Este informe no reemplaza la auditoría ni el informe de transferencia.

ELABORADO POR
Panta Quiroga Corporativo — EIRL

PLATAFORMA DE ANÁLISIS
KRONOS Gestión de Datos

Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com

Escanee para escribir por WhatsApp
