INFORME DETALLADO · MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

Cómo recibe usted el presupuesto municipal

Lo que muestran los datos públicos del presupuesto 2023–2026, explicado para quien asumirá la alcaldía en enero.

Datos del MEF al 11/11/2026 · las cifras de 2026 son parciales

Antes de leer. Todo sale de lo que el MEF publica: presupuesto, gasto registrado (devengado) e ingresos registrados. Esos datos no muestran el avance físico de las obras, los contratos, el dinero en cuentas ni las deudas no registradas. Por eso aquí se separan los datos de las señales que conviene revisar; la última sección dice qué pedir.

1. Qué presupuesto hay y cuánto se ha ejecutado

AÑO	PIA	PIM	DEVENGADO	DEVENGADO ÷ PIM	NO DEVENGADO
2023	S/ 63.7 M	S/ 107.8 M	S/ 76.5 M	70.9 %	S/ 31.4 M
2024	S/ 112.7 M	S/ 125.1 M	S/ 84.1 M	67.2 %	S/ 41.0 M
2025	S/ 84.1 M	S/ 121.9 M	S/ 90.9 M	74.6 %	S/ 31.0 M
2026*	S/ 69.0 M	S/ 128.2 M	S/ 89.1 M	69.5 %	S/ 39.1 M

PIA: presupuesto de apertura · PIM: presupuesto modificado (final en 2023–2025, vigente en 2026) · Devengado: obligación de pago reconocida. *2026 al 11/11/2026.

En 2026 el PIM es S/ 128.2 M, S/ 59.2 M más que el PIA (+86 %). Que un monto esté en el PIM no significa que el dinero haya llegado ni que estuviera disponible desde enero: los datos no dicen cuándo se incorporó. En 2023–2025 se devengó en promedio el 70.9 % del PIM final y quedaron sin gastar S/ 34.5 millones por año. Ese saldo no es ahorro ni dinero disponible por sí mismo.

Qué significa para usted. El reto inmediato no es solo conseguir más recursos, sino ejecutar los que ya hay: en los años cerrados quedaron sin devengar unos S/ 34.5 millones por año.

2. Frente a los mismos meses de años anteriores


A fin de octubre de 2026 se había devengado el **52.8 %** del PIM. En 2023–2025, a la misma fecha, el promedio fue **52.5 %** (55.9 %, 45.2 % y 56.4 %). 2026 va como siempre, y eso no es una buena noticia: es el mismo gasto concentrado a fin de año que en esos años dejó casi 3 de cada 10 soles sin gastar.

Frente a las demás municipalidades provinciales del departamento de Tumbes, a la misma fecha:

MUNICIPALIDAD	DEVENGADO ÷ PIM A FIN DE OCTUBRE	PROMEDIO 2023–2025
MP Zarumilla	60.3 %	79.9 %
MP Tumbes	52.8 %	70.9 %
MP Contralmirante Villar	44.1 %	75.0 %

Fuente: MEF, Datos Abiertos, mismo archivo para todas. Comparar no explica las causas.

Devengado acumulado como % del PIM, mes a mes

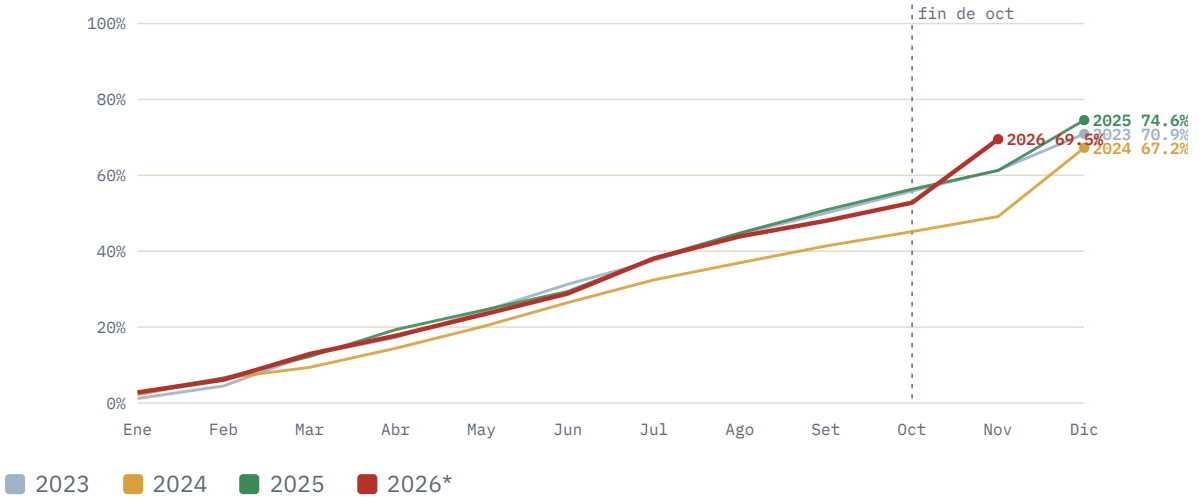

Fuente: MEF, Datos Abiertos. Años cerrados sobre su PIM final (comparación retrospectiva); 2026 sobre el PIM vigente.

Al 11/11/2026 va en 69.5 %. Si se gastara lo mismo cada día, llevaría 86.3 %; esa referencia lineal solo da un orden de magnitud, no es una meta ni una programación oficial.

> **Qué significa para usted.** Si nada cambia, 2027 corre el riesgo de repetir el gasto tardío. Pida desde enero una programación mensual de gasto y de obras, y revísela cada mes.

3. Dónde se concentra el saldo

De los S/ 39.1 M que faltan devengar, S/ 27.1 M (69 %) son obras y equipos (genérica 2.6). Los 47 proyectos con CUI tienen S/ 27.0 M por devengar, y cinco concentran S/ 20.7 M (77 %):

PROYECTO	PIM 2026	DEVENGADO ÷ PIM 2026	SALDO
Mejoramiento y ampliacion de la red principal de agua y alcantarillado del sector nor este y nor oeste del AA.HH. los claveles pampa grande distrito de Tumbes, provincia de Tumbes - Tumbes CUI 2226075	S/ 19.6 M	53.0 %	S/ 9.2 M
Fortalecimiento institucional CUI 2000634	S/ 4.3 M	0.0 %	S/ 4.3 M
Mejoramiento y ampliacion del servicio de saneamiento basico rural en el centro poblado el Limón, provincia de Tumbes - Tumbes CUI 2338724	S/ 4.1 M	0.0 %	S/ 4.1 M
Creacion del servicio de practica deportiva y/o recreativa en plataforma deportiva sector las lomas distrito de Tumbes de la provincia de Tumbes del departamento de Tumbes CUI 2657160	S/ 1.6 M	0.0 %	S/ 1.6 M
Mejoramiento y ampliacion del servicio de seguridad ciudadana local en la municipalidad provincial de Tumbes distrito de Tumbes de la provincia de Tumbes del departamento de Tumbes CUI 2567228	S/ 21.7 M	93.0 %	S/ 1.5 M

El porcentaje es avance financiero del año, no avance físico; un 0 % no prueba que la obra no haya empezado. El PIM anual no es el costo total del proyecto.

El 92.7 % del PIM ya está certificado: tiene crédito disponible para comprometerse este año (art. 41.1 del D. Leg. 1440). Lo que un contrato deba pagar en 2027 o después requiere una previsión presupuestaria (art. 41.4), ajustada a la programación multianual y a la capacidad de financiamiento (Oficio Circular N.° 0035-2026-EF/50.07). Hay S/ 11.1 M certificados que todavía no tienen compromiso registrado. El dato no dice si hay contratos o procesos en marcha: es algo que hay que preguntar, no una causa probada.

> **Qué significa para usted.** Estos proyectos definen su primer mes de gestión: decidir si continúan, se reprograman o se revisan requiere tener a la vista el expediente, el contrato y el avance físico de cada uno.

4. Cómo cambian los ingresos

En el PIM 2026 pesan: FONCOMUN 28 %, operaciones de crédito 20 %, canon y sobrecanon 19 %, recursos ordinarios 17 %, impuestos municipales 9 %, recursos directamente recaudados 6 %. Los recursos propios son el 15 % del PIM. Lo que entró de enero a octubre de cada año (sin saldos de balance):

- **Canon y sobrecanon:** S/ 12.2 M, 16 % menos que en 2025 y 35 % menos que en 2023; ha bajado cada año desde 2023.
- **Ingresos propios:** S/ 11.1 M, 16 % menos que en 2025. El predial explica S/ 1.4 M de la caída de S/ 2.1 M; en 2025 incluyó una regularización tributaria que en 2026 casi no aparece.
- **FONCOMUN:** S/ 28.4 M, 37 % más que en 2025.

Las operaciones de crédito suman S/ 25.9 M de PIM: certificados de Obras por Impuestos (CIPRL) por S/ 21.6 M y bonos del Tesoro por S/ 4.2 M. En noviembre se devengaron S/ 20.1 M de la obra de seguridad ciudadana, aún sin girado ni ingreso registrado; los CIPRL que se usen se repagan con recursos determinados de años siguientes.

Saldo de balance (clasificador 1.9.1.1.1.1): en 2026 se presupuestaron S/ 10.3 M y se registraron S/ 6.9 M, una diferencia de S/ 3.5 M calculada con valores sin redondear (2023: S/ 4.2 M; 2024: –S/ 1.4 M; 2025: S/ 0.3 M). Cuánto de eso está en las cuentas solo lo dicen los saldos bancarios.

> **Qué significa para usted.** Sus ingresos dependen de transferencias que han bajado. No asuma gasto permanente contando con que el canon se recupere, y recuerde que la obra por impuestos se descontará del canon de los próximos años.

5. Escenarios de cierre 2026

ESCENARIO	EJECUCIÓN AL CIERRE	SIN DEVENGAR
Menor ejecución	76.0 %	S/ 30.8 M
Central	**82.2 %**	**S/ 22.8 M**
Mayor ejecución	91.0 %	S/ 11.5 M

Cómo se calcula cada escenario: ver el anexo al final.

Si noviembre y diciembre se parecen a 2023–2025, el año cerraría en **82.2 %** y quedarían **S/ 22.8 millones** sin devengar; el rango de referencia va de 76.0 % a 91.0 %. Ese cálculo suma aparte los S/ 20.1 M de la obra por impuestos, que siguen el cronograma de la obra y no el ritmo de la municipalidad. Sin esa obra, el central sería 66.5 %, por debajo del promedio de los años cerrados (70.9 %): no hay señal de que el gasto se haya acelerado. Son escenarios, no pronósticos, y suponen que el PIM no cambia. Para gastar todo el PIM harían falta S/ 23.8 M por mes, más de tres veces el promedio mensual del año (S/ 6.8 M).

Prueba con años pasados. Con el mismo método y datos a fin de octubre, el central habría dado 58.8 % para 2024 (real: 67.2 %) y 73.4 % para 2025 (real: 74.6 %): desviaciones de 8.5 y 1.1 puntos; el real quedó dentro del rango. Los escenarios son referencias, no límites.

¿Saldo real o presupuesto sin sincerar? El MEF estimó para 2026 S/ 12.7 M de canon y sobrecanon (Comunicado N.° 0018-2026-EF/50.01, 27/10/2026); el PIM mantiene S/ 20.5 M. En total, unos **S/ 11.7 M** de ingresos del PIM 2026 no llegarían este año (51 % del saldo del escenario central): esa parte no sería dinero sin gastar sino presupuesto no sincerado. Además, S/ 3.5 M de saldo de balance presupuestado aún no figuran como ingreso registrado. En años anteriores también quedaron ingresos sin recaudar al cierre: 2023: S/ 8.2 M; 2024: S/ 4.3 M; 2025: S/ 8.3 M. Medido contra los ingresos que llegarán, el avance a fin de octubre de 2026 sería 58 % (frente a 60 % en 2025 con la misma medida). La Ley 32732 autorizó a reducir el PIM con las estimaciones del MEF: conviene revisar el nivel actual del PIM y presupuestar 2027 con esas estimaciones.

> **Qué significa para usted.** En el escenario central quedarían unos S/ 22.8 millones sin devengar. Parte podría volver en 2027 como saldo de balance, pero no el canon presupuestado que no llegue, y solo si el dinero está en las cuentas: confírmelo con Tesorería antes de contar con él.

6. Deuda y margen para pagar

AÑO	DEUDA TOTAL	FRENTE AL LÍMITE	INGRESO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	AHORRO EN CTA. CTE.
2023	S/ 19.7 M	32 %	S/ 64.5 M	S/ 47.4 M	S/ 17.1 M
2024	S/ 31.9 M	50 %	S/ 63.3 M	S/ 47.0 M	S/ 16.3 M
2025	S/ 12.9 M	20 %	S/ 63.6 M	S/ 58.4 M	S/ 5.2 M
2026*	S/ 10.6 M	16 %	S/ 32.4 M	S/ 26.4 M	S/ 6.0 M

Fuente: MEF, informes de reglas fiscales de gobiernos locales (evaluación anual 2023–2025; 2026* = seguimiento del 2T: ingresos y gastos de enero a junio, pasivos a marzo). La deuda total no incluye beneficios sociales, pensiones ni juicios.

Según los informes anuales del MEF, la municipalidad cumplió las dos reglas fiscales en 2023, 2024 y 2025, y el seguimiento del segundo trimestre de 2026 también las muestra cumplidas, sin adelantar el resultado anual. El registro de deuda de la DGTP no muestra préstamos ni bonos al 31/05/2026, pero no recoge los S/ 20.1 M de CIPRL devengados en noviembre, que se pagarán con canon y otros recursos de los próximos años. La deuda subió en 2024 y bajó en 2025, y el MEF no publica su detalle. En 2025 el gasto corriente subió 24 % con ingresos corrientes casi iguales, y el ahorro en cuenta corriente (resultado presupuestal, no caja) bajó de S/ 16.3 a S/ 5.2 millones. Eso podría explicar las tensiones de caja (hipótesis); se confirma con el flujo de caja de Tesorería. Los estados financieros 2023–2025, analizados aparte en este portal, tienen saldos por depurar.

> **Qué significa para usted.** La deuda está dentro de los límites legales, pero el ahorro corriente cayó. Su margen real lo dirá la caja, no las reglas fiscales: pida el flujo de caja antes de comprometer pagos nuevos.

7. El condicionante de las lluvias

Conviene separar cuatro cosas. El **fenómeno**: el ENFEN (comunicado N.° 19-2026, 30/10/2026) prevé un Niño costero de magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, medido por la temperatura del mar. Las **lluvias**: se pronostican sobre lo normal en la costa norte, sin un pronóstico específico para la provincia. La **emergencia**: la provincia ha estado en 2026 bajo declaratorias por lluvias encadenadas (D.S. N.° 005, 097, 124 y 149-2026-PCM); la vigente, el D.S. N.° 149-2026-PCM (03/11/2026, 60 días, nivel 4), incluye los seis distritos de la provincia y vence alrededor del 1 de enero de 2027 si el plazo corre desde su publicación; su continuidad no habilita por sí sola mecanismos presupuestarios de 2027. En 2025, año con lluvias intensas, la actividad de emergencia devengó el 31 % de su PIM (S/ 2.8 M de S/ 9.1 M); en 2026, el monitoreo y los simulacros quedaron sin PIM. Los **efectos** sobre la caja y las obras son hipótesis; la baja ejecución se observa desde antes.

> **Qué significa para usted.** La respuesta a las lluvias depende de tener al día el plan de prevención y los registros del SINPAD; sin ellos, los pedidos de recursos de emergencia suelen demorar (hipótesis).

8. Lo que estos datos no permiten saber y qué pedir

SEÑAL EN LOS DATOS	QUÉ PEDIR (RESPONSABLE PROPUESTO)	PRODUCTO VERIFICABLE
Saldo no devengado y saldo de balance	Saldos bancarios por fuente y conciliaciones (Tesorería y Contabilidad)	Conciliación al 31/12/2026
Proyectos con bajo avance financiero	Avance físico, valorizaciones y estado contractual (Obras)	Ficha por CUI con avance físico
Certificado no comprometido (S/ 11.1 M)	Estado de cada certificación (Abastecimiento)	Relación de certificaciones con su situación
CIPRL y bonos del Tesoro	Convenio, cronograma de repago y norma de incorporación (Gerencia Municipal y Presupuesto)	Expediente del financiamiento
Deuda sin detalle ni contingencias	Estado de situación financiera; sentencias, beneficios sociales y pensiones (Contabilidad, Procuraduría, RR. HH.)	Inventario de obligaciones con montos
Emergencia por lluvias	Decreto vigente y su anexo, plan ante lluvias, registros SINPAD y requisitos FONDES 2027 (Gestión del Riesgo)	Vigencia confirmada; plan aprobado
Presupuesto 2027	PIA 2027 aprobado frente al PIA 2026 (S/ 69.0 M) y previsiones presupuestarias emitidas: CUI, monto y fuente (Presupuesto)	PIA 2027 por fuente y genérica; relación de previsiones

Anexo. Cómo se calcularon los escenarios de cierre 2026

MÉTODO (LOS 1 A 4 SE PROMEDIAN)	VALOR APLICADO	RESULTADO
1. Factor de cierre	×1.364 (promedio de ×1.280, ×1.489, ×1.323) sobre S/ 67.7 M	S/ 112.4 M
2. Gasto nov–dic como % del PIM	18.8 % × S/ 102.3 M	S/ 107.0 M
3. Gasto nov–dic como % de lo que faltaba	39.9 % × (PIM – devengado)	S/ 101.6 M
4. Ritmo de los tres últimos meses	S/ 6.3 M × 2	S/ 100.3 M
Escenario central	promedio de 1 a 4 (incluye S/ 20.1 M de crédito): 82.2 % del PIM	**S/ 105.3 M**
Rango de referencia	central -22.9 % / +32.8 % de lo que falta devengar: 76.0 % / 91.0 %	S/ 97.4 M / S/ 116.7 M

Cómo se calculó. Devengado ÷ PIM con el PIM vigente (2026) o final (años cerrados); referencia lineal = días transcurridos ÷ 365. El promedio de cuatro métodos se adoptó porque, aplicado a unas 1 900 municipalidades en 2024 y 2025, se equivocó menos que el anterior; el rango usa los percentiles 10 y 90 de esos errores. El rubro 19 (CIPRL y bonos) queda fuera de los métodos: se suma lo ya devengado al corte (S/ 20.1 M). Este informe no reemplaza la auditoría ni el informe de transferencia.

ELABORADO POR
Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.

PLATAFORMA DE ANÁLISIS
KRONOS Gestión de Datos

Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com

Escanee para escribir por WhatsApp
