INFORME DETALLADO · MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

Cómo recibe usted el presupuesto municipal

Lo que muestran los datos públicos del presupuesto 2023–2026, explicado para quien asumirá la alcaldía en enero.

Datos del MEF al 11/11/2026 · las cifras de 2026 son parciales

Antes de leer. Todo sale de lo que el MEF publica: presupuesto, gasto registrado (devengado) e ingresos registrados. Esos datos no muestran el avance físico de las obras, los contratos, el dinero en cuentas ni las deudas no registradas. Por eso aquí se separan los datos de las señales que conviene revisar; la última sección dice qué pedir.

1. Qué presupuesto hay y cuánto se ha ejecutado

AÑO	PIA	PIM	DEVENGADO	DEVENGADO ÷ PIM	NO DEVENGADO
2023	S/ 30.3 M	S/ 70.3 M	S/ 56.6 M	80.6 %	S/ 13.6 M
2024	S/ 39.9 M	S/ 59.9 M	S/ 44.6 M	74.4 %	S/ 15.3 M
2025	S/ 40.9 M	S/ 57.5 M	S/ 48.7 M	84.7 %	S/ 8.8 M
2026*	S/ 34.0 M	S/ 45.1 M	S/ 27.9 M	61.9 %	S/ 17.2 M

PIA: presupuesto de apertura · PIM: presupuesto modificado (final en 2023–2025, vigente en 2026) · Devengado: obligación de pago reconocida. *2026 al 11/11/2026.

En 2026 el PIM es S/ 45.1 M, S/ 11.1 M más que el PIA (+33 %), pero mucho menos que en años anteriores: S/ 70.3 M en 2023 y S/ 57.5 M en 2025. Que un monto esté en el PIM no significa que el dinero haya llegado. En 2023–2025 se devengó en promedio el 79.9 % del PIM final y quedaron sin gastar S/ 12.6 millones por año.

Qué significa para usted. Recibe un presupuesto más chico que el de sus antecesores. Antes de prometer obras nuevas, conviene saber cuánto del PIA 2027 ya está comprometido.

2. Frente a los mismos meses de años anteriores


A fin de octubre de 2026 se había devengado el **60.3 %** del PIM. En 2023–2025, a la misma fecha, el promedio fue **66.1 %** (55.6 %, 64.1 % y 78.6 %). 2026 va por debajo del promedio y muy por detrás de 2025, el año en que más avanzó a esta altura.

Frente a las demás municipalidades provinciales del departamento de Tumbes, a la misma fecha:

MUNICIPALIDAD	DEVENGADO ÷ PIM A FIN DE OCTUBRE	PROMEDIO 2023–2025
MP Zarumilla	60.3 %	79.9 %
MP Tumbes	52.8 %	70.9 %
MP Contralmirante Villar	44.1 %	75.0 %

Fuente: MEF, Datos Abiertos, mismo archivo para todas. Comparar no explica las causas.

Devengado acumulado como % del PIM, mes a mes

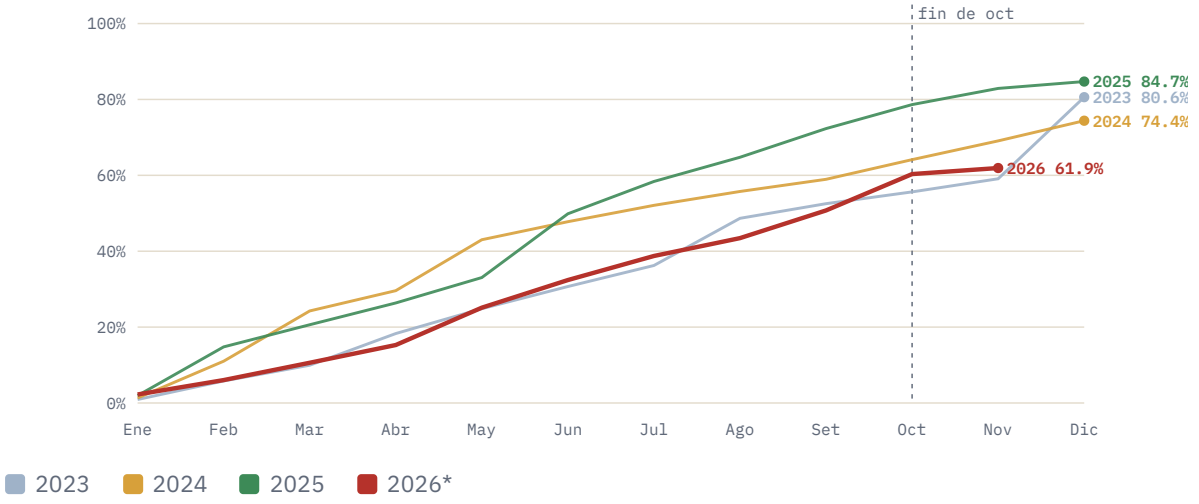

Fuente: MEF, Datos Abiertos. Años cerrados sobre su PIM final (comparación retrospectiva); 2026 sobre el PIM vigente.

Al 11/11/2026 va en 61.9 %. Si se gastara lo mismo cada día, llevaría 86.3 %; esa referencia lineal solo da un orden de magnitud, no es una meta ni una programación oficial.

> **Qué significa para usted.** Si nada cambia, 2027 repetirá el gasto concentrado a fin de año. Pida desde enero una programación mensual de gasto y de obras, y revísela cada mes.

3. Dónde se concentra el saldo

De los S/ 17.2 M que faltan devengar, S/ 11.9 M (69 %) son obras y equipos (genérica 2.6), donde el avance es de 40.8 %. Los 40 proyectos con CUI tienen S/ 11.8 M por devengar, y cinco concentran S/ 9.3 M (79 %). Ninguno es de prevención ante lluvias:

PROYECTO	PIM 2026	DEVENGADO ÷ PIM 2026	SALDO
Mejoramiento del servicio vial y peatonal en el AA.HH. Las Flores del distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla - Tumbes CUI 2188398	S/ 5.0 M	37.3 %	S/ 3.1 M
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial y peatonal de la calle Loreto tramo entre la calle Ucayali y pasaje Los Tulipanes, calle Sucre tramo entre la calle Ucayali y calle Lizardo Montero, calle Los Geranios tramo entre la calle Santa Rosa y calle Los Libertadores, calle Carlos Otiniano tramo ente la calle Ucayali y pasaje Zarumilla, pasaje Zarumilla, pasaje s/n, pasaje Los Tulipanes, pasaje Las Begonias del distrito de Zarumilla - provincia de Zarumilla - departamento de Tumbes CUI 2494410	S/ 1.7 M	0.0 %	S/ 1.7 M
Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el coliseo deportivo del AA.HH. Miraflores del distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes CUI 2620384	S/ 1.7 M	2.0 %	S/ 1.6 M
Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el complejo deportivo de las intersecciones de la calle Libertadores y el pasaje Tulipanes del AA.HH. Héroes del Cenepa del distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes CUI 2629450	S/ 1.5 M	0.0 %	S/ 1.5 M
Mejoramiento del camino vecinal ruta TU-514 El Pasayo del distrito de Papayal - provincia de Zarumilla - departamento de Tumbes CUI 2552545	S/ 3.2 M	57.4 %	S/ 1.4 M

El porcentaje es avance financiero del año, no avance físico; un 0 % no prueba que la obra no haya empezado. El PIM anual no es el costo total del proyecto.

El 85.9 % del PIM ya está certificado, es decir, reservado para un gasto. Pero S/ 5.6 M certificados todavía no tienen compromiso registrado. El dato no dice si hay contratos o procesos en marcha: es algo que hay que preguntar, no una causa probada.

> **Qué significa para usted.** Estos proyectos definen su primer mes de gestión: decidir si continúan, se reprograman o se revisan requiere el expediente, el contrato y el avance físico de cada uno.

4. Cómo cambian los ingresos

En el PIM 2026 pesan: canon y sobrecanon 39 %, FONCOMUN 32 %, recursos ordinarios 12 %, operaciones de crédito 11 %, impuestos municipales 4 %, recursos directamente recaudados 3 %, donaciones y transferencias 1 %. Los recursos propios son solo el 6 % del PIM. Lo que entró de enero a octubre de cada año (sin saldos de balance):

- **Canon y sobrecanon:** S/ 8.7 M, 28 % menos que en 2025 y 41 % menos que en 2023. Es la principal fuente de la municipalidad.
- **Ingresos propios:** S/ 1.4 M, 16 % menos que en 2025. Predial: S/ 0.5 M (2025: S/ 0.7 M).
- **FONCOMUN:** S/ 9.6 M, 25 % más que en 2025; compensa solo en parte la caída del canon.

Las operaciones de crédito suman S/ 5.0 M de PIM, todo en bonos del Tesoro, con S/ 1.6 M devengados al corte, sobre todo en la vía del A.H. Las Flores.

Saldo de balance (clasificador 1.9.1.1.1.1): en 2026 se presupuestaron S/ 2.6 M y se registraron S/ 1.3 M. En 2023 se habían registrado S/ 14.6 M: la municipalidad llega a 2026 con mucho menos dinero de

años anteriores (diferencias entre lo presupuestado y lo registrado, con valores sin redondear: 2023: −S/ 0.1 M; 2024: −S/ 0.1 M; 2025: S/ 5.6 M). Cuánto hay en las cuentas solo lo dicen los saldos bancarios.

> **Qué significa para usted.** El canon, su principal ingreso, viene cayendo. No asuma gasto permanente contando con que se recupere.

5. Escenarios de cierre 2026

ESCENARIO	EJECUCIÓN AL CIERRE	SIN DEVENGAR
Menor ejecución	65.6 %	S/ 15.5 M
Central	**73.2 %**	**S/ 12.1 M**
Mayor ejecución	85.8 %	S/ 6.4 M

Cómo se calcula cada escenario: ver el anexo al final.

Si noviembre y diciembre se parecen a 2023–2025, el año cerraría en **73.2 %** y quedarían **S/ 12.1 millones** sin devengar; los escenarios extremos van de 65.6 % a 85.8 %. El cálculo suma aparte los S/ 1.6 M ya devengados con bonos del Tesoro, que siguen el cronograma de la obra. Son escenarios, no pronósticos, y suponen que el PIM no cambia. Para gastar todo el PIM harían falta S/ 10.4 M por mes, frente a un promedio mensual de S/ 2.7 M en el año.

> **Qué significa para usted.** En el escenario central quedarían unos S/ 12.1 millones sin devengar. Parte podría volver en 2027 como saldo de balance, pero solo si el dinero está en las cuentas: confírmelo con Tesorería.

6. Deuda y margen para pagar

AÑO	DEUDA TOTAL	FRENTE AL LÍMITE	INGRESO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	AHORRO EN CTA. CTE.
2023	S/ 18.1 M	39 %	S/ 30.8 M	S/ 22.7 M	S/ 8.1 M
2024	S/ 74.4 M	147 %	S/ 29.1 M	S/ 23.3 M	S/ 5.8 M
2025	S/ 84.5 M	179 %	S/ 26.4 M	S/ 18.9 M	S/ 7.5 M
2026*	S/ 85.4 M	196 %	S/ 9.4 M	S/ 10.3 M	S/ -0.8 M

Fuente: MEF, informes de reglas fiscales de gobiernos locales (evaluación anual 2023–2025; 2026* = seguimiento 2T2026). La deuda total no incluye beneficios sociales, pensiones ni juicios.

Según los informes anuales del MEF, la municipalidad cumplió las dos reglas fiscales en 2023, pero no cumple la de deuda desde 2024: el saldo pasó de S/ 18.1 millones a S/ 74.4 millones en un año y llegó a S/ 84.5 millones en 2025, 179 % de sus ingresos corrientes promedio (el límite es 100 %). En el seguimiento del segundo trimestre de 2026 (pasivos a marzo) sube a S/ 85.4 millones y, por primera vez, también incumple la regla de ahorro: el gasto corriente superó al ingreso corriente. El registro de la DGTP al 31/05/2026 solo muestra S/ 11.1 M en dos créditos del MEF por CIPRL, por vencer y sin atraso; el MEF no publica de qué se compone el resto. El salto de 2024 podría deberse a obligaciones

reconocidas al cierre contable (hipótesis), algo que solo aclaran los estados financieros. Incumplir la regla de deuda puede restringir el endeudamiento y obligar a un compromiso de ajuste con el MEF; sus efectos concretos deben confirmarse con el MEF.

> **Qué significa para usted.** Este es el punto más delicado de la transferencia: la municipalidad incumple la regla de deuda y no se sabe de qué se compone. Deje constancia en el acta de lo que recibe y pida el detalle antes de asumir pagos nuevos.

7. El condicionante de las lluvias

Hay que separar cuatro cosas. El **fenómeno**: el ENFEN (comunicado N.° 19-2026, 30/10/2026) prevé un Niño costero de magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, medido por la temperatura del mar. Las **lluvias**: se pronostican sobre lo normal en la costa norte, sin un pronóstico específico para la provincia. La **emergencia**: el D.S. N.° 149-2026-PCM (03/11/2026, 60 días, nivel 4) incluye los cuatro distritos de la provincia; si el plazo corre desde su publicación, terminaría al empezar la nueva gestión. Los **daños**: el 1 y 2 de noviembre el río Zarumilla se desbordó en Aguas Verdes y Papayal. Aun así, la actividad de emergencia (5006144) no tiene PIM en 2026; en 2023 tuvo S/ 4.1 M y en 2024, S/ 4.5 M, casi todo devengado. El mantenimiento de cauces y drenajes bajó de S/ 82 400 en el PIA a S/ 6 000.

> **Qué significa para usted.** La temporada más fuerte de lluvias coincidirá con sus primeras semanas. Sin declaratoria vigente, registros del SINPAD al día y la actividad de emergencia habilitada, no podrá pagar la respuesta con rapidez.

8. Lo que estos datos no permiten saber y qué pedir

SEÑAL EN LOS DATOS	QUÉ PEDIR (RESPONSABLE PROPUESTO)	PRODUCTO VERIFICABLE
Saldo no devengado y saldo de balance	Saldos bancarios por fuente y conciliaciones (Tesorería y Contabilidad)	Conciliación al 31/12/2026
Proyectos con bajo avance financiero	Avance físico, valorizaciones y estado contractual (Obras)	Ficha por CUI con avance físico
Certificado no comprometido (S/ 5.6 M)	Estado de cada certificación (Abastecimiento)	Relación de certificaciones con su situación
CIPRL y bonos del Tesoro	Convenio, cronograma de repago y norma de incorporación (Gerencia Municipal y Presupuesto)	Expediente del financiamiento
Deuda de S/ 84.5 M sin detalle	Estados financieros con notas; composición de la deuda usada en la regla fiscal; cronograma de los CIPRL (Contabilidad, Presupuesto, DGTP)	Inventario de obligaciones con acreedor, monto y vencimiento
Contingencias	Sentencias en ejecución, beneficios sociales y pensiones (Procuraduría y RR. HH.)	Relación con montos y fechas
Emergencia por lluvias	Texto y anexo del decreto de emergencia, plan ante lluvias, registros SINPAD y requisitos FONDES (Gestión del Riesgo)	Ámbito y vencimiento confirmados; plan aprobado
Presupuesto 2027	PIA 2027 aprobado frente al PIA 2026 (S/ 34.0 M) (Presupuesto)	PIA 2027 por fuente y genérica

Anexo. Cómo se calcularon los escenarios de cierre 2026

MÉTODO	VALOR APLICADO	RESULTADO	USO
Factor de cierre 2023	×1.449 sobre S/ 25.6 M + S/ 1.6 M de crédito	S/ 38.7 M	Candidato a extremo; entra al promedio
Factor de cierre 2024	×1.144 sobre S/ 25.6 M + S/ 1.6 M de crédito	S/ 30.9 M	Candidato a extremo; entra al promedio
Factor de cierre 2025	×1.093 sobre S/ 25.6 M + S/ 1.6 M de crédito	S/ 29.6 M	Candidato a extremo; entra al promedio
Gasto nov–dic como % del PIM	14.4 % × S/ 40.1 M + S/ 1.6 M de crédito	S/ 33.0 M	Entra al central; candidato a extremo
Escenario central	(promedio de factores + método anterior) ÷ 2	**S/ 33.0 M**	73.2 % del PIM
Menor / mayor ejecución	mínimo / máximo de los cuatro candidatos	S/ 29.6 M / S/ 38.7 M	65.6 % / 85.8 %

Cómo se calculó. Devengado ÷ PIM con el PIM vigente (2026) o final (años cerrados). Referencia lineal = días transcurridos ÷ 365. Escenario central = promedio de dos métodos aplicados al devengado a fin de octubre: factor de cierre (devengado anual ÷ devengado a fin de octubre) y gasto de noviembre–diciembre como % del PIM, de 2023–2025; menor y mayor = el valor más bajo y el más alto entre los factores y el segundo método; todo limitado al PIM actual. Las operaciones oficiales de crédito (rubro 19: CIPRL y bonos) quedan fuera de ambos métodos, porque su devengado sigue el cronograma de la obra financiada y no el ritmo de gasto de la municipalidad: a cada escenario se suma lo ya devengado con ese rubro al corte (S/ 1.6 M) y no se proyecta el resto de su PIM. Saldo no devengado = PIM − devengado. Este informe no reemplaza la auditoría ni el informe de transferencia.

ELABORADO POR
PANTA QUIROGA CORPORATIVO E.I.R.L.
PLATAFORMA DE ANÁLISIS
KRONOS Gestión de Datos
Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com
Escanee para escribir por WhatsApp
