INFORME DETALLADO · MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

Cómo recibe usted el presupuesto municipal

Lo que muestran los datos públicos del presupuesto 2023–2026, explicado para quien asumirá la alcaldía en enero.

Datos del MEF al 11/11/2026 · las cifras de 2026 son parciales

Antes de leer. Todo sale de lo que el MEF publica: presupuesto, gasto registrado (devengado) e ingresos registrados. Esos datos no muestran el avance físico de las obras, los contratos, el dinero en cuentas ni las deudas no registradas. Por eso aquí se separan los datos de las señales que conviene revisar; la última sección dice qué pedir.

1. Qué presupuesto hay y cuánto se ha ejecutado

AÑO	PIA	PIM	DEVENGADO	DEVENGADO ÷ PIM	NO DEVENGADO
2023	S/ 63.7 M	S/ 107.8 M	S/ 76.5 M	70.9 %	S/ 31.4 M
2024	S/ 112.7 M	S/ 125.1 M	S/ 84.1 M	67.2 %	S/ 41.0 M
2025	S/ 84.1 M	S/ 121.9 M	S/ 90.9 M	74.6 %	S/ 31.0 M
2026*	S/ 69.0 M	S/ 128.2 M	S/ 89.1 M	69.5 %	S/ 39.1 M

PIA: presupuesto de apertura · PIM: presupuesto modificado (final en 2023–2025, vigente en 2026) · Devengado: obligación de pago reconocida. *2026 al 11/11/2026.

En 2026 el presupuesto (PIM) es S/ 128.2 M: S/ 59.2 M más que al inicio del año (+86 %). Que un monto esté en el presupuesto no significa que el dinero haya llegado, ni que estuviera disponible desde enero. Los datos no dicen cuándo se incorporó. En 2023–2025 gastó en promedio el 70.9 % de su presupuesto final. Cada año quedaron sin gastar unos S/ 34.5 millones. Ese saldo no es ahorro ni dinero disponible por sí mismo.

Qué significa para usted. El reto no es solo conseguir más dinero, sino gastar bien el que ya hay. En los años cerrados quedaron sin gastar unos S/ 34.5 millones por año.

2. Frente a los mismos meses de años anteriores


A fin de octubre de 2026 había gastado el **52.8 %** de su presupuesto. A la misma fecha de 2023–2025, el promedio fue **52.5 %** (55.9 %, 45.2 % y 56.4 %). 2026 va como siempre, y eso no es una buena noticia. Es el mismo gasto amontonado a fin de año que en esos años dejó casi 3 de cada 10 soles sin gastar.

Frente a las demás municipalidades provinciales del departamento de Tumbes, a la misma fecha:

MUNICIPALIDAD	DEVENGADO ÷ PIM A FIN DE OCTUBRE	PROMEDIO 2023–2025
MP Zarumilla	60.3 %	79.9 %
MP Tumbes	52.8 %	70.9 %
MP Contralmirante Villar	44.1 %	75.0 %

Fuente: MEF, Datos Abiertos, mismo archivo para todas. Comparar no explica las causas.

Devengado acumulado como % del PIM, mes a mes

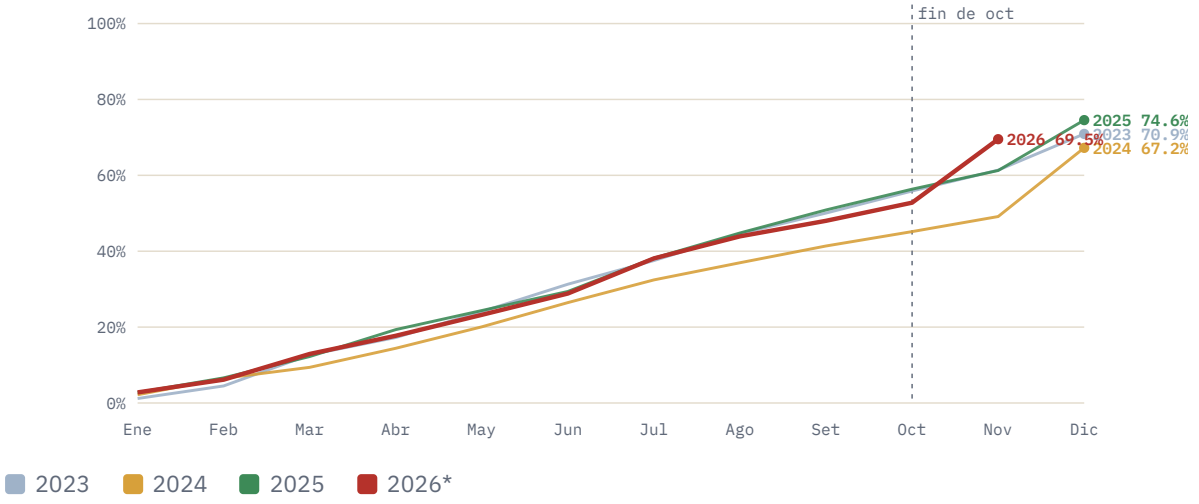

Fuente: MEF, Datos Abiertos. Años cerrados sobre su PIM final (comparación retrospectiva); 2026 sobre el PIM vigente.

Al 11/11/2026 va en 69.5 %. Si se gastara lo mismo cada día, llevaría 86.3 %; es solo una referencia, no una meta ni una programación oficial.

> **Qué significa para usted.** Si nada cambia, 2027 corre el riesgo de repetir el gasto tardío. Pida desde enero una programación mensual de gasto y de obras, y revísela cada mes.

3. Dónde se concentra el saldo

De los S/ 39.1 M que faltan devengar, S/ 27.1 M (69 %) son obras y equipos (genérica 2.6). Los 47 proyectos con CUI tienen S/ 27.0 M por devengar, y cinco concentran S/ 20.7 M (77 %):

PROYECTO	PIM 2026	DEVENGADO ÷ PIM 2026	SALDO	OBRA AVANZADA (DECLARADO)
Mejoramiento y ampliacion de la red principal de agua y alcantarillado del sector nor este y nor oeste del AA.HH. los claveles pampa grande distrito de Tumbes, provincia de Tumbes - Tumbes CUI 2226075	S/ 19.6 M	53.0 %	S/ 9.2 M	87 % (gastado: 84 %)
Fortalecimiento institucional CUI 2000634	S/ 4.3 M	0.0 %	S/ 4.3 M	—
Mejoramiento y ampliacion del servicio de saneamiento basico rural en el centro poblado el Limón, provincia de Tumbes - Tumbes CUI 2338724	S/ 4.1 M	0.0 %	S/ 4.1 M	0 % (gastado: 2 %)
Creacion del servicio de practica deportiva y/o recreativa en plataforma deportiva sector las lomas distrito de Tumbes de la provincia de Tumbes del departamento de Tumbes CUI 2657160	S/ 1.6 M	0.0 %	S/ 1.6 M	sin registro
Mejoramiento y ampliacion del servicio de seguridad ciudadana local en la municipalidad provincial de Tumbes distrito de Tumbes de la provincia de Tumbes del departamento de Tumbes CUI 2567228	S/ 21.7 M	93.0 %	S/ 1.5 M	46 % (gastado: 65 %)

Obra avanzada: la declara la municipalidad en el Formato N.° 12-B del MEF (al 12/11/2026). Entre paréntesis, lo gastado de su costo total en todos los años.

El porcentaje es avance financiero del año, no avance físico; un 0 % no prueba que la obra no haya empezado. El PIM anual no es el costo total del proyecto.

El 92.7 % del presupuesto ya está certificado, es decir, reservado para gastarse este año (art. 41.1 del D. Leg. 1440). Lo que un contrato deba pagar en 2027 o después necesita una previsión presupuestaria (art. 41.4). Esa previsión debe ajustarse a la programación multianual y a lo que se puede financiar (Oficio Circular N.° 0035-2026-EF/50.07). Hay S/ 11.1 M reservados que todavía no tienen un contrato registrado. El dato no dice si hay contratos o procesos en marcha: hay que preguntarlo.

> **Qué significa para usted.** Estos proyectos marcarán su primer mes. Para decidir si siguen, se reprograman o se revisan, necesitará el expediente, el contrato y el avance físico de cada uno.

4. Cómo cambian los ingresos

En el PIM 2026 pesan: FONCOMUN 28 %, operaciones de crédito 20 %, canon y sobrecanon 19 %, recursos ordinarios 17 %, impuestos municipales 9 %, recursos directamente recaudados 6 %. Los recursos propios son el 15 % del PIM. Lo que entró de enero a octubre de cada año (sin saldos de balance):

- **Canon y sobrecanon:** S/ 12.2 M, 16 % menos que en 2025 y 35 % menos que en 2023; ha bajado cada año desde 2023.
- **Ingresos propios:** S/ 11.1 M, 16 % menos que en 2025. El predial explica S/ 1.4 M de la caída de S/ 2.1 M; en 2025 incluyó una regularización tributaria que en 2026 casi no aparece.

- **FONCOMUN:** S/ 28.4 M, 37 % más que en 2025.

Los créditos suman S/ 25.9 M en el presupuesto: certificados de Obras por Impuestos (CIPRL) por S/ 21.6 M y bonos del Tesoro por S/ 4.2 M. En noviembre se registró un gasto de S/ 20.1 M en la obra de seguridad ciudadana, aún sin pago ni ingreso registrado. Los CIPRL que se usen se devuelven con recursos de años siguientes.

Saldo de balance (dinero de años anteriores que no se gastó): en 2026 se presupuestaron S/ 10.3 M y se registraron S/ 6.9 M. La diferencia es S/ 3.5 M. Cuánto de eso está en las cuentas solo lo dicen los saldos bancarios. (Diferencias de años anteriores: 2023: S/ 4.2 M; 2024: –S/ 1.4 M; 2025: S/ 0.3 M.)

> **Qué significa para usted.** Sus ingresos dependen de transferencias que han bajado. No asuma gasto permanente contando con que el canon se recupere. Y recuerde que la obra por impuestos se descontará del canon de los próximos años.

5. Escenarios de cierre 2026

ESCENARIO	EJECUCIÓN AL CIERRE	SIN DEVENGAR
Menor ejecución	76.0 %	S/ 30.8 M
Central	**82.2 %**	**S/ 22.8 M**
Mayor ejecución	91.0 %	S/ 11.5 M

Cómo se calcula cada escenario: ver el anexo al final.

Si noviembre y diciembre se parecen a 2023–2025, el año cerraría en **82.2 %**. Quedarían **S/ 22.8 millones** sin gastar. El rango de referencia va de 76.0 % a 91.0 %. Ese cálculo suma aparte los S/ 20.1 M de la obra por impuestos. Ese gasto sigue el cronograma de la obra, no el ritmo de la municipalidad. Sin esa obra, el central sería 66.5 %, por debajo del promedio de los años cerrados (70.9 %): no hay señal de que el gasto se haya acelerado. Son escenarios, no pronósticos, y suponen que el PIM no cambia. Para gastar todo el PIM harían falta S/ 23.8 M por mes, más de tres veces el promedio mensual del año (S/ 6.8 M).

Prueba con años pasados. Si este método se hubiera usado a fin de octubre, habría anticipado 58.8 % para 2024 (cerró en 67.2 %) y 73.4 % para 2025 (cerró en 74.6 %). Se habría equivocado en 8.5 y 1.1 puntos. El cierre real quedó dentro del rango. Los escenarios son referencias, no límites.

¿Saldo real o presupuesto sin sincerar? El MEF estimó para 2026 S/ 12.7 M de canon y sobrecanon (Comunicado N.° 0018-2026-EF/50.01, 27/10/2026); el PIM mantiene S/ 20.5 M. En total, unos **S/ 11.7 M** del presupuesto 2026 no llegarían este año. Es el 51 % del saldo sin gastar del escenario central. Esa parte no es dinero sin gastar: es presupuesto que no se ajustó a los ingresos reales. Además, S/ 3.5 M de saldo de balance presupuestado aún no figuran como ingreso registrado. En años anteriores también quedaron ingresos sin recaudar al cierre: 2023: S/ 8.2 M; 2024: S/ 4.3 M; 2025: S/ 8.3 M. Si se quita ese dinero de la cuenta, a fin de octubre de 2026 se habría gastado 58 de cada 100 soles (60 en 2025, con el mismo ajuste). La Ley 32732 permitió reducir el presupuesto con las estimaciones del MEF. Conviene revisar el presupuesto actual y preparar el de 2027 con esas estimaciones.

Qué significa para usted. En el escenario central quedarían unos S/ 22.8 millones sin devengar. Una parte podría volver en 2027 como saldo de balance, pero solo si el dinero está en las cuentas. El canon que no llegue no volverá. Confírmelo con Tesorería antes de contar con él.

6. Deuda y margen para pagar

AÑO	DEUDA TOTAL	FRENTE AL LÍMITE	INGRESO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	AHORRO EN CTA. CTE.
2023	S/ 19.7 M	32 %	S/ 64.5 M	S/ 47.4 M	S/ 17.1 M
2024	S/ 31.9 M	50 %	S/ 63.3 M	S/ 47.0 M	S/ 16.3 M
2025	S/ 12.9 M	20 %	S/ 63.6 M	S/ 58.4 M	S/ 5.2 M
2026*	S/ 10.6 M	16 %	S/ 32.4 M	S/ 26.4 M	S/ 6.0 M

Fuente: MEF, informes de reglas fiscales de gobiernos locales (evaluación anual 2023–2025; 2026* = seguimiento del 2T: ingresos y gastos de enero a junio, pasivos a marzo). La deuda total no incluye beneficios sociales, pensiones ni juicios.

Según los informes anuales del MEF, la municipalidad cumplió las dos reglas fiscales en 2023, 2024 y 2025. El seguimiento de mitad de 2026 también las muestra cumplidas, sin adelantar el resultado del año. El registro de deuda del MEF (DGTP) no muestra préstamos ni bonos al 31/05/2026. Pero tampoco recoge los S/ 20.1 M de CIPRL de noviembre, que se pagarán con canon y otros recursos de los próximos años. La deuda subió en 2024 y bajó en 2025, y el MEF no publica su detalle. En 2025 el gasto corriente subió 24 %, con ingresos corrientes casi iguales. Lo que sobra del ingreso corriente bajó de S/ 16.3 a S/ 5.2 millones (no es saldo de caja). Eso podría explicar la falta de caja (hipótesis); se confirma con el flujo de caja de Tesorería. Los estados financieros 2023–2025, analizados aparte en este portal, tienen saldos por depurar.

Qué significa para usted. La deuda está dentro de los límites legales, pero el ahorro corriente cayó. Su margen real lo dirá la caja, no las reglas fiscales: pida el flujo de caja antes de comprometer pagos nuevos.

7. El condicionante de las lluvias

Conviene separar cuatro cosas. El **fenómeno**: el ENFEN (comunicado N.° 19-2026, 30/10/2026) prevé un Niño costero extraordinario hasta febrero de 2027, medido por la temperatura del mar. Las **lluvias**: se pronostican sobre lo normal en la costa norte, sin un pronóstico específico para la provincia. La **emergencia**: en 2026 la provincia tuvo una declaratoria por lluvias tras otra (D.S. N.° 005, 097, 124 y 149-2026-PCM). La vigente es el D.S. N.° 149-2026-PCM (03/11/2026, 60 días, nivel 4). Incluye los seis distritos y vence alrededor del 1 de enero de 2027. Que continúe no habilita por sí solo normas presupuestarias de 2027. En 2025, año de lluvias intensas, la partida de emergencia gastó el 31 % de su presupuesto (S/ 2.8 M de S/ 9.1 M). En 2026, el monitoreo y los simulacros quedaron sin presupuesto. Los **efectos** sobre la caja y las obras son hipótesis; la baja ejecución se observa desde antes.

Qué significa para usted. Para responder a las lluvias necesitará al día el plan de prevención y los registros del SINPAD. Sin ellos, los pedidos de dinero para emergencias suelen demorar (hipótesis).

8. Lo que estos datos no permiten saber y qué pedir

SEÑAL EN LOS DATOS	QUÉ PEDIR (RESPONSABLE PROPUESTO)	PRODUCTO VERIFICABLE
Saldo no devengado y saldo de balance	Saldos bancarios por fuente y conciliaciones (Tesorería y Contabilidad)	Conciliación al 31/12/2026
Proyectos con bajo avance financiero	Avance físico, valorizaciones y estado contractual (Obras)	Ficha por CUI con avance físico
Certificado no comprometido (S/ 11.1 M)	Estado de cada certificación (Abastecimiento)	Relación de certificaciones con su situación
CIPRL y bonos del Tesoro	Convenio, cronograma de repago y norma de incorporación (Gerencia Municipal y Presupuesto)	Expediente del financiamiento
Deuda sin detalle ni contingencias	Estado de situación financiera; sentencias, beneficios sociales y pensiones (Contabilidad, Procuraduría, RR. HH.)	Inventario de obligaciones con montos
Emergencia por lluvias	Decreto vigente y su anexo, plan ante lluvias, registros SINPAD y requisitos FONDES 2027 (Gestión del Riesgo)	Vigencia confirmada; plan aprobado
Presupuesto 2027	PIA 2027 aprobado frente al PIA 2026 (S/ 69.0 M) y previsiones presupuestarias emitidas: CUI, monto y fuente (Presupuesto)	PIA 2027 por fuente y genérica; relación de previsiones

Anexo. Cómo se calcularon los escenarios de cierre 2026

MÉTODO (LOS 1 A 4 SE PROMEDIAN)	VALOR APLICADO	RESULTADO
1. Factor de cierre	×1.364 (promedio de ×1.280, ×1.489, ×1.323) sobre S/ 67.7 M	S/ 112.4 M
2. Gasto nov–dic como % del PIM	18.8 % × S/ 102.3 M	S/ 107.0 M
3. Gasto nov–dic como % de lo que faltaba	39.9 % × (PIM – devengado)	S/ 101.6 M
4. Ritmo de los tres últimos meses	S/ 6.3 M × 2	S/ 100.3 M
Escenario central	promedio de 1 a 4 (incluye S/ 20.1 M de crédito): 82.2 % del PIM	**S/ 105.3 M**
Rango de referencia	central -22.9 % / +32.8 % de lo que falta devengar: 76.0 % / 91.0 %	S/ 97.4 M / S/ 116.7 M

Cómo se calculó. Devengado ÷ PIM con el PIM vigente (2026) o final (años cerrados); referencia lineal = días transcurridos ÷ 365. El escenario central promedia cuatro métodos: fue el que menos se equivocó al probarlo en unas 1 900 municipalidades (2024–2025). El rango usa los percentiles 10 y 90 de esos errores. El rubro 19 (CIPRL y bonos) queda fuera de los métodos: se suma lo ya devengado al corte (S/ 20.1 M). Este informe no reemplaza la auditoría ni el informe de transferencia.

ELABORADO POR
Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.

PLATAFORMA DE ANÁLISIS
KRONOS Gestión de Datos

Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com

Escanee para escribir por WhatsApp
