INFORME DETALLADO · MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ÓRGANOS

# Cómo recibe usted el presupuesto municipal

*Lo que muestran los datos públicos del presupuesto 2023–2026, explicado para quien asumirá la alcaldía en enero.*

Datos del MEF al 11/11/2026 · las cifras de 2026 son parciales

**Antes de leer.** Todo sale de lo que el MEF publica: presupuesto, gasto registrado (devengado) e ingresos registrados. Esos datos no muestran el avance físico de las obras, los contratos, el dinero en cuentas ni las deudas no registradas. Por eso aquí se separan los datos de las señales que conviene revisar; la última sección dice qué pedir.

## 1. Qué presupuesto hay y cuánto se ha ejecutado

| AÑO | PIA | PIM | DEVENGADO | DEVENGADO ÷ PIM | NO DEVENGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **2023** | S/ 12.8 M | S/ 32.7 M | S/ 27.9 M | 85.6 % | S/ 4.7 M |
| **2024** | S/ 25.8 M | S/ 39.0 M | S/ 28.2 M | 72.4 % | S/ 10.8 M |
| **2025** | S/ 12.8 M | S/ 34.9 M | S/ 14.1 M | 40.4 % | S/ 20.8 M |
| **2026*** | S/ 14.7 M | S/ 37.7 M | S/ 24.1 M | 64.0 % | S/ 13.6 M |

PIA: presupuesto de apertura · PIM: presupuesto modificado (final en 2023–2025, vigente en 2026) · Devengado: obligación de pago reconocida. *2026 al 11/11/2026.

En 2026 el PIM es S/ 37.7 M, S/ 23.0 M más que el PIA (+157 %). Buena parte de ese aumento es saldo de balance: la transferencia para el malecón turístico que llegó en 2025 y no se gastó ese año. En 2023–2025 se devengó en promedio el 66.1 % del PIM final, pero con mucha diferencia entre años: 85.6 % en 2023, 72.4 % en 2024, 40.4 % en 2025.

**Qué significa para usted.** Una sola obra puede mover la ejecución de todo el año. Pida la lista de obras grandes con su fuente y su cronograma antes de evaluar cómo va el gasto.

## 2. Frente a los mismos meses de años anteriores


A fin de octubre de 2026 se había devengado el **62.6 %** del PIM. En 2023–2025, a la misma fecha, el promedio fue **53.3 %** (62.1 %, 54.7 % y 43.1 %). 2026 va mejor que esos años, y la razón principal es una sola obra: el malecón turístico, con S/ 12.9 M devengados en 2026. Sin ella, el resto del presupuesto iría en 50.5 % al 11/11/2026.

Frente a las demás municipalidades distritales de la provincia de Talara, a la misma fecha:

| MUNICIPALIDAD | DEVENGADO ÷ PIM A FIN DE OCTUBRE | PROMEDIO 2023–2025 |
|---|---|---|
| MD Máncora | 72.3 % | 70.0 % |
| **MD Los Órganos** | 62.6 % | 66.1 % |
| MD La Brea | 59.6 % | 71.5 % |
| MD El Alto | 49.6 % | 70.5 % |
| MD Lobitos | 45.1 % | 55.8 % |

Fuente: MEF, Datos Abiertos, mismo archivo para todas. Comparar no explica las causas.

**Devengado acumulado como % del PIM, mes a mes**

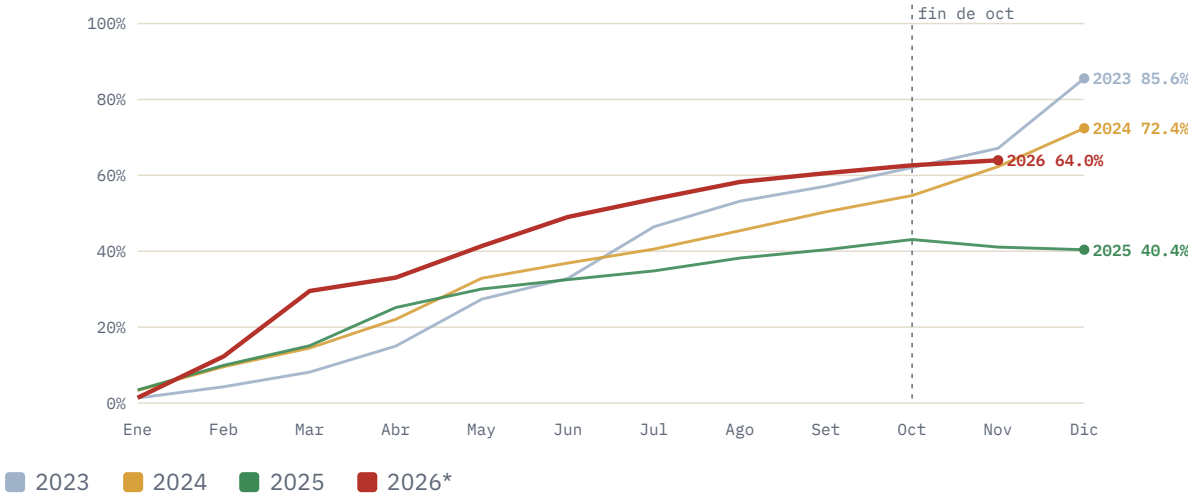


Fuente: MEF, Datos Abiertos. Años cerrados sobre su PIM final (comparación retrospectiva); 2026 sobre el PIM vigente.

Al 11/11/2026 va en 64.0 %. Si se gastara lo mismo cada día, llevaría 86.3 %; esa referencia lineal solo da un orden de magnitud, no es una meta ni una programación oficial.

> **Qué significa para usted.** Si nada cambia, 2027 dependerá otra vez de una o dos obras. Pida desde enero una programación mensual de gasto y de obras, y revísela cada mes.

## 3. Dónde se concentra el saldo

De los S/ 13.6 M que faltan devengar, S/ 9.9 M (73 %) son obras y equipos (genérica 2.6). Los 23 proyectos con CUI tienen S/ 9.8 M por devengar, y cinco concentran S/ 8.5 M (86 %). El de mayor saldo, la rehabilitación del colegio 14915, casi no ha empezado:

| PROYECTO | PIM 2026 | DEVENGADO ÷ PIM 2026 | SALDO |
|---|---|---|---|
| Rehabilitación del local escolar 14915 con código local 439661, institución educativa primaria Divino Cristo Rey del distrito Los Órganos, provincia de Talara - departamento de Piura CUI 2533732 | S/ 2.7 M | 1.1 % | S/ 2.7 M |
| Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos en el malecón turístico Los Órganos del distrito de Los Órganos - provincia de Talara - departamento de Piura CUI 2618985 | S/ 15.5 M | 83.4 % | S/ 2.6 M |
| Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del asentamiento humano Puerto Antiguo mz. f1, i, j1, j2, n, pasaje San Carlos y San Jorge, distrito de Los Órganos - provincia de Talara - departamento de Piura CUI 2543691 | S/ 1.2 M | 0.0 % | S/ 1.2 M |
| Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el asentamiento humano José Peña Quiroga del distrito de Los Órganos - provincia de Talara - departamento de Piura CUI 2609291 | S/ 1.1 M | 0.0 % | S/ 1.1 M |
| Creación de los servicios públicos de integración económica y social en la alameda ubicada en la Av. Panamericana al frente del Grupo Aéreo Los Órganos del distrito de Los Órganos de la provincia de Talara del departamento de Piura CUI 2587183 | S/ 0.9 M | 0.0 % | S/ 0.9 M |

El porcentaje es avance financiero del año, no avance físico; un 0 % no prueba que la obra no haya empezado. El PIM anual no es el costo total del proyecto.

El 84.1 % del PIM ya está certificado: tiene crédito disponible para comprometerse este año (art. 41.1 del D. Leg. 1440). Lo que un contrato deba pagar en 2027 o después requiere una previsión presupuestaria (art. 41.4), ajustada a la programación multianual y a la capacidad de financiamiento (Oficio Circular N.° 0035-2026-EF/50.07). Hay S/ 3.4 M certificados que todavía no tienen compromiso registrado. El dato no dice si hay contratos o procesos en marcha: es algo que hay que preguntar, no una causa probada.

> **Qué significa para usted.** Estos proyectos definen su primer mes de gestión: decidir si continúan, se reprograman o se revisan requiere el expediente, el contrato y el avance físico de cada uno.

## 4. Cómo cambian los ingresos

En el PIM 2026 pesan: donaciones y transferencias 38 %, canon y sobrecanon 27 %, impuestos municipales 8 %, recursos ordinarios 7 %, operaciones de crédito 7 %, FONCOMUN 7 %, recursos directamente recaudados 6 %. El primer rubro es sobre todo el saldo de la transferencia del malecón. Los recursos propios son el 14 % del PIM. Lo que entró de enero a octubre de cada año (sin saldos de balance):

- **Canon y sobrecanon:** S/ 4.3 M, 11 % menos que en 2025 y 47 % menos que en 2023.
- **Ingresos propios:** S/ 3.7 M, 36 % más que en 2025. El predial subió a S/ 2.1 M (2025: S/ 1.5 M): es la buena noticia de los ingresos.
- **FONCOMUN:** S/ 1.6 M, 19 % más que en 2025.

Las operaciones de crédito suman S/ 2.7 M de PIM en bonos del Tesoro, casi sin devengado al corte (S/ 29 800).

Saldo de balance (clasificador 1.9.1.1.1.1): en 2026 se presupuestaron S/ 16.4 M y se registraron S/ 14.3 M (diferencias de años anteriores, con valores sin redondear: 2023: −S/ 3.1 M; 2024: S/ 1.4 M; 2025: S/ 2.6 M). Cuánto hay en las cuentas solo lo dicen los saldos bancarios.

> **Qué significa para usted.** El canon baja, pero el predial sube. Cuidar la recaudación propia es la palanca que depende de usted.

## 5. Escenarios de cierre 2026

| ESCENARIO | EJECUCIÓN AL CIERRE | SIN DEVENGAR |
|---|---|---|
| Menor ejecución | 65.1 % | S/ 13.1 M |
| **Central** | **73.7 %** | **S/ 9.9 M** |
| Mayor ejecución | 85.9 % | S/ 5.3 M |

Cómo se calcula cada escenario: ver el anexo al final.

Si noviembre y diciembre se parecen a 2023–2025, el año cerraría en **73.7 %** y quedarían **S/ 9.9 millones** sin devengar; el rango de referencia va de 65.1 % a 85.9 %. Son escenarios, no pronósticos, y suponen que el PIM no cambia. Para gastar todo el PIM harían falta S/ 8.3 M por mes, frente a un promedio mensual de S/ 2.4 M en el año.

**Prueba con años pasados.** Con el mismo método y datos a fin de octubre, el central habría dado 75.1 % para 2024 (real: 72.4 %) y 60.6 % para 2025 (real: 40.4 %): desviaciones de 2.7 y 20.2 puntos; el real quedó fuera del rango en 1 de 2 casos. Los escenarios son referencias, no límites.

**¿Saldo real o presupuesto sin sincerar?** Al ritmo de los años anteriores, unos **S/ 4.6 M** de ingresos del PIM 2026 no llegarían este año (46 % del saldo del escenario central), sobre todo canon y sobrecanon (PIM S/ 8.4 M frente a unos S/ 4.8 M esperados). Esa parte no sería dinero sin gastar sino presupuesto no sincerado (hipótesis que confirma Presupuesto). Además, S/ 2.1 M de saldo de balance presupuestado aún no figuran como ingreso registrado. La Ley 32732 autorizó a reducir el PIM con las estimaciones de ingresos que el MEF publicó en julio y octubre de 2026: conviene revisar el nivel actual del PIM y presupuestar 2027 con esas estimaciones.

> **Qué significa para usted.** En el escenario central quedarían unos S/ 9.9 millones sin devengar. Parte podría volver en 2027 como saldo de balance, pero solo si el dinero está en las cuentas: confírmelo con Tesorería.

## 6. Deuda y margen para pagar

| AÑO | DEUDA TOTAL | FRENTE AL LÍMITE | INGRESO CORRIENTE | GASTO CORRIENTE | AHORRO EN CTA. CTE. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2023** | S/ 8.6 M | 30 % | S/ 14.5 M | S/ 9.3 M | S/ 5.2 M |
| **2024** | S/ 9.7 M | 33 % | S/ 13.1 M | S/ 8.3 M | S/ 4.8 M |
| **2025** | S/ 10.4 M | 42 % | S/ 10.0 M | S/ 7.7 M | S/ 2.3 M |
| **2026*** | S/ 11.6 M | 52 % | S/ 8.3 M | S/ 5.7 M | S/ 2.6 M |

Fuente: MEF, informes de reglas fiscales de gobiernos locales (evaluación anual 2023–2025; 2026* = seguimiento 2T2026). La deuda total no incluye beneficios sociales, pensiones ni juicios.

Según los informes anuales del MEF, la municipalidad cumplió las dos reglas fiscales en 2023, 2024 y 2025, y el seguimiento del segundo trimestre de 2026 también las muestra cumplidas, sin adelantar el resultado anual. El registro de la DGTP no muestra préstamos ni bonos a su nombre al 31/05/2026; Máncora, en cambio, registra S/ 10.1 M en CIPRL. El margen se achica: la deuda total subió de S/ 8.6 a S/ 10.4 millones y pasó a 52 % de los ingresos corrientes promedio en el segundo trimestre de 2026, mientras el ingreso corriente bajó de S/ 14.5 a S/ 10.0 millones y el ahorro en cuenta corriente (resultado presupuestal, no caja), de S/ 5.2 a S/ 2.3 millones. La caída del canon podría explicar buena parte de esa tendencia (hipótesis).

> **Qué significa para usted.** Las reglas fiscales se cumplen, pero con menos margen cada año. Pida el flujo de caja antes de comprometer pagos nuevos.

## 7. El condicionante de las lluvias

Hay que separar cuatro cosas. El **fenómeno**: el ENFEN (comunicado N.° 19-2026, 30/10/2026) prevé un Niño costero de magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, medido por la temperatura del mar. Las **lluvias**: se pronostican sobre lo normal en la costa norte, sin un pronóstico específico para el distrito; en febrero de 2026 ya afectaron el agua en Máncora y Los Órganos. La **emergencia**: Talara ha estado en 2026 bajo declaratorias por lluvias encadenadas (D.S. N.° 025, 097, 124 y 149-2026-PCM); la vigente, el D.S. N.° 149-2026-PCM (03/11/2026, 60 días, nivel 4), incluye los seis distritos y vence alrededor del 1 de enero de 2027 si el plazo corre desde su publicación. Los **recursos**: la actividad de emergencia (5006144) tiene S/ 0.8 M de PIM en 2026 y va en 13 %; en 2025 se devengó el 36 %. No hay presupuesto para kits de ayuda humanitaria.

> **Qué significa para usted.** La temporada fuerte de lluvias coincidirá con sus primeras semanas. Tener la actividad de emergencia habilitada no basta: hace falta ejecutarla rápido y con los daños registrados en el SINPAD.

## 8. Lo que estos datos no permiten saber y qué pedir

| SEÑAL EN LOS DATOS | QUÉ PEDIR (RESPONSABLE PROPUESTO) | PRODUCTO VERIFICABLE |
|---|---|---|
| Saldo no devengado y saldo de balance | Saldos bancarios por fuente y conciliaciones (Tesorería y Contabilidad) | Conciliación al 31/12/2026 |

| SEÑAL EN LOS DATOS | QUÉ PEDIR (RESPONSABLE PROPUESTO) | PRODUCTO VERIFICABLE |
|---|---|---|
| Proyectos con bajo avance financiero | Avance físico, valorizaciones y estado contractual (Obras) | Ficha por CUI con avance físico |
| Certificado no comprometido (S/ 3.4 M) | Estado de cada certificación (Abastecimiento) | Relación de certificaciones con su situación |
| CIPRL y bonos del Tesoro | Convenio, cronograma de repago y norma de incorporación (Gerencia Municipal y Presupuesto) | Expediente del financiamiento |
| Deuda sin detalle ni contingencias | Estado de situación financiera; sentencias, beneficios sociales y pensiones (Contabilidad, Procuraduría, RR. HH.) | Inventario de obligaciones con montos |
| Emergencia por lluvias | Decreto vigente y su anexo, plan ante lluvias, registros SINPAD y requisitos FONDES (Gestión del Riesgo) | Vigencia confirmada; plan aprobado |
| Presupuesto 2027 | PIA 2027 aprobado frente al PIA 2026 (S/ 14.7 M) y previsiones presupuestarias emitidas: CUI, monto y fuente (Presupuesto) | PIA 2027 por fuente y genérica; relación de previsiones |

## Anexo. Cómo se calcularon los escenarios de cierre 2026

| MÉTODO (LOS 1 A 4 SE PROMEDIAN) | VALOR APLICADO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 1. Factor de cierre | ×1.213 (promedio de ×1.378, ×1.324, ×0.938) sobre S/ 23.6 M | S/ 28.7 M |
| 2. Gasto nov–dic como % del PIM | 12.8 % × S/ 37.7 M | S/ 28.5 M |
| 3. Gasto nov–dic como % de lo que faltaba | 32.1 % × (PIM – devengado) | S/ 28.1 M |
| 4. Ritmo de los tres últimos meses | S/ 1.1 M × 2 | S/ 25.8 M |
| **Escenario central** | promedio de 1 a 4: 73.7 % del PIM | **S/ 27.8 M** |
| Rango de referencia | central -22.9 % / +32.8 % de lo que falta devengar: 65.1 % / 85.9 % | S/ 24.5 M / S/ 32.4 M |

**Cómo se calculó.** Devengado ÷ PIM con el PIM vigente (2026) o final (años cerrados); referencia lineal = días transcurridos ÷ 365. El promedio de cuatro métodos se adoptó porque, aplicado a unas 1 900 municipalidades en 2024 y 2025, se equivocó menos que el anterior; el rango usa los percentiles 10 y 90 de esos errores. Este informe no reemplaza la auditoría ni el informe de transferencia.

ELABORADO POR
Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.

PLATAFORMA DE ANÁLISIS
KRONOS Gestión de Datos

**Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.**
997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com

Escanee para escribir por WhatsApp
