INFORME DETALLADO · MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

Cómo recibe usted el presupuesto municipal

Lo que muestran los datos públicos del presupuesto 2023–2026, explicado para quien asumirá la alcaldía en enero.

Datos del MEF al 10/11/2026 · las cifras de 2026 son parciales

Antes de leer. Todo sale de lo que el MEF publica: presupuesto, gasto registrado (devengado) e ingresos registrados. Esos datos no muestran el avance físico de las obras, los contratos, el dinero en cuentas ni las deudas no registradas. Por eso aquí se separan los datos de las señales que conviene revisar; la última sección dice qué pedir.

1. Qué presupuesto hay y cuánto se ha ejecutado

AÑO	PIA	PIM	DEVENGADO	DEVENGADO ÷ PIM	NO DEVENGADO
2023	S/ 258.4 M	S/ 288.3 M	S/ 208.5 M	72.3 %	S/ 79.9 M
2024	S/ 288.9 M	S/ 339.6 M	S/ 247.2 M	72.8 %	S/ 92.4 M
2025	S/ 291.5 M	S/ 362.8 M	S/ 294.8 M	81.2 %	S/ 68.1 M
2026*	S/ 301.2 M	S/ 329.6 M	S/ 233.6 M	70.9 %	S/ 95.9 M

PIA: presupuesto de apertura · PIM: presupuesto modificado (final en 2023–2025, vigente en 2026) · Devengado: obligación de pago reconocida. *2026 al 10/11/2026.

En 2026 el presupuesto (PIM) es S/ 329.6 M: S/ 28.4 M más que al inicio del año (+9 %). Los datos no dicen cuándo se incorporó cada monto. No debe suponerse que todo estuvo disponible desde enero, ni que lo presupuestado sea dinero recibido. En los años cerrados gastó en promedio el 75.4 % de su presupuesto final. Cada año quedaron sin gastar unos S/ 80.1 millones. Ese saldo no equivale por sí solo a ahorro, pérdida ni dinero disponible.

Qué significa para usted. Lo que recibe no es un problema de falta de presupuesto, sino de ejecución. Su primera pregunta a la gestión saliente es por qué cada año quedaron sin devengar unos S/ 80.1 millones.

2. Frente a los mismos meses de años anteriores

A fin de octubre de 2026 había gastado el **69.3 %** de su presupuesto. A la misma fecha de 2023–2025, el promedio fue **53.4 %** (53.3 %, 49.1 % y 58.0 %). 2026 va 16 puntos por encima de lo habitual. Y no solo en porcentaje: lo gastado a esa fecha (S/ 228.4 M) es más que en 2025. Aun así, en los


años cerrados el gasto se amontonó al final y dejó casi 1 de cada 4 soles sin gastar. Además, el presupuesto todavía puede crecer antes del cierre, y eso bajaría el porcentaje (hipótesis).

Frente a las 5 municipalidades distritales de la provincia de Lima con el PIM 2026 más cercano (de 41), a la misma fecha:

MUNICIPALIDAD	DEVENGADO ÷ PIM A FIN DE OCTUBRE	PROMEDIO 2023–2025
MD Miraflores	77.1 %	82.3 %
MD La Victoria	73.1 %	94.6 %
MD San Martin de Porres	70.8 %	86.6 %
MD San Isidro	69.3 %	75.4 %
MD Ate - Vitarte	69.0 %	85.6 %
MD La Molina	67.4 %	93.5 %

Fuente: MEF, Datos Abiertos, mismo archivo para todas. Comparar no explica las causas.

Devengado acumulado como % del PIM, mes a mes

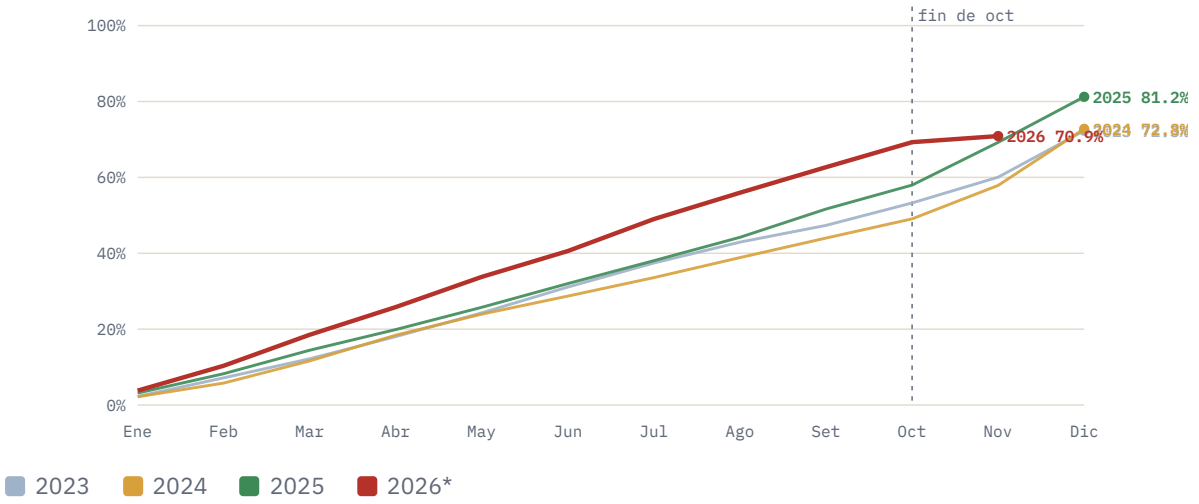

Fuente: MEF, Datos Abiertos. Años cerrados sobre su PIM final (comparación retrospectiva); 2026 sobre el PIM vigente.

Si se gastara lo mismo cada día, al 10 de noviembre se llevaría 86.0 %. Esa referencia lineal sirve como orden de magnitud: no es una programación oficial ni un monto que debía gastarse.

> **Qué significa para usted.** El buen ritmo de 2026 no asegura un buen cierre: depende de lo que se devengue en noviembre–diciembre. En la transferencia, pida el devengado al 31 de diciembre y compárelo con los escenarios de la sección 5.

3. Dónde se concentra el saldo

De los S/ 95.9 M aún no devengados, S/ 20.4 M (21 %) están en la adquisición de activos no financieros (genérica 2.6). Dentro de ella, la cartera de 19 proyectos con CUI tiene S/ 17.8 M por devengar, y cinco proyectos concentran S/ 15.1 M (84 % de ese saldo):

PROYECTO	PIM 2026	DEVENGADO ÷ PIM 2026	SALDO
Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de San Isidro - Lima - Lima CUI 2325535	S/ 15.3 M	49.0 %	S/ 7.8 M
Adquisicion de terreno; en el(la) para los servicios del centro integral de atencion al adulto mayor - ciam del sector 3 en el centro poblado San Isidro, distrito de San Isidro, provincia Lima, departamento Lima CUI 2718028	S/ 4.6 M	0.0 %	S/ 4.6 M
Reparacion de piscina deportiva (recreativa); renovacion de cobertura de instalaciones deportivas y espacio de circulacion peatonal horizontal y/o vertical; remodelacion de servicios higienicos y/o vestidores; en el(la) piscina municipal - sector 1 en el centro poblado San Isidro, distrito de San Isidro, provincia Lima, departamento Lima CUI 2705566	S/ 1.9 M	38.0 %	S/ 1.2 M
Remodelacion de armado de alumbrado publico; en el(la) vias urbanas de los sectores 1-4, 2-2 y 2-7 en el centro poblado San Isidro, distrito de San Isidro, provincia Lima, departamento Lima CUI 2731141	S/ 0.8 M	0.0 %	S/ 0.8 M
Adquisicion de deposito de residuos solidos; en el(la) en las estaciones de reciclaje en el centro poblado San Isidro, distrito de San Isidro, provincia Lima, departamento Lima CUI 2738897	S/ 0.7 M	0.0 %	S/ 0.7 M

El porcentaje es avance financiero del año, no avance físico; un 0 % no prueba que la obra no haya empezado. El PIM anual no es el costo total del proyecto.

El 89.4 % del presupuesto ya está certificado, es decir, reservado para gastarse este año (art. 41.1 del D. Leg. 1440). Lo que un contrato deba pagar en 2027 o después necesita una previsión presupuestaria (art. 41.4). Esa previsión debe ajustarse a la programación multianual y a lo que se puede financiar (Oficio Circular N.° 0035-2026-EF/50.07). Una certificación alta no descarta problemas de planificación. Hay S/ 10.8 M reservados que todavía no tienen un contrato registrado. El dato no dice si hay contratos o procesos en marcha: es una señal para revisar.

> **Qué significa para usted.** Antes de anunciar obras nuevas, conozca cómo van estos proyectos y sus contratos. Ahí está el dinero ya asignado y las obligaciones que usted heredará.

4. Cómo cambian los ingresos

En el PIM 2026 pesan: impuestos municipales 56 %, recursos directamente recaudados 41 %, donaciones y transferencias 1 %, FONCOMUN 1 %, recursos ordinarios 0 %, canon y sobrecanon 0 %. Que los rubros propios sean el 98 % del PIM habla de la composición del presupuesto, no de cuánto se recauda. Comparando lo registrado de enero a octubre de cada año (sin saldos de balance):

- **Canon y sobrecanon:** S/ 0.3 M, 35 % más que en 2025 y 20 % más que en 2023.
- **Ingresos propios:** S/ 259.1 M, 10 % más que en 2025. Predial: S/ 112.6 M (2025: S/ 108.5 M). Del aumento de S/ 22.9 M, alcabala aporta S/ 10.5 M, arbitrios de parques y jardines S/ 6.3 M y predial S/ 4.1 M.
- **FONCOMUN:** S/ 2.5 M, 11 % más que en 2025.

El PIM 2026 no incluye operaciones de crédito (rubro 19): no hay préstamos, bonos del Tesoro ni CIPRL presupuestados.

Saldo de balance (dinero de años anteriores que no se gastó): en 2026 se presupuestaron S/ 51.4 M y se registraron S/ 67.6 M. La diferencia es −S/ 16.2 M. Estos datos no dicen por sí solos su causa ni cuánto hay en el banco. (Diferencias de años anteriores: 2023: S/ 5.5 M; 2024: S/ 15.6 M; 2025: S/ 0.5 M.)

> **Qué significa para usted.** Los ingresos propios crecen y le dan autonomía para decidir. El saldo de balance, en cambio, solo es dinero disponible si está en las cuentas bancarias. Confírmelo con la conciliación de Tesorería antes de programar gasto con él.

5. Escenarios de cierre 2026

ESCENARIO	EJECUCIÓN AL CIERRE	SIN DEVENGAR
Menor ejecución	82.0 %	S/ 59.5 M
Central	**89.0 %**	**S/ 36.3 M**
Mayor ejecución	99.1 %	S/ 3.1 M

Cómo se calcula cada escenario: ver el anexo al final.

Si noviembre y diciembre repiten lo ocurrido en 2023–2025, el año cerraría en **89.0 %** (escenario central) y quedarían **S/ 36.3 millones** sin devengar. El rango de referencia va de 82.0 % (S/ 59.5 millones sin devengar) a 99.1 % (S/ 3.1 millones); sin el repunte de fin de año, 82.5 %. Son escenarios, no pronósticos, y suponen que el PIM no cambia. Devengar todo el PIM exigiría unos S/ 57.3 M por mes.

Prueba con años pasados. Si este método se hubiera usado a fin de octubre, habría anticipado 66.0 % para 2024 (cerró en 72.8 %) y 77.3 % para 2025 (cerró en 81.2 %). Se habría equivocado en 6.8 y 3.9 puntos. El cierre real quedó dentro del rango. Los escenarios son referencias, no límites.

¿Saldo real o presupuesto sin sincerar? Los ingresos ya registrados y los que se esperan hasta el 31/12 alcanzan para cubrir el presupuesto 2026 en cada fuente. Por eso, el saldo sin gastar no viene de un presupuesto inflado. (Ingresos presupuestados que no se recaudaron al cierre de años anteriores: 2023: S/ 5.6 M; 2024: S/ 1.1 M; 2025: S/ 0.0 M.)

> **Qué significa para usted.** Si se cumple el escenario central, empezará 2027 con unos S/ 36.3 millones que podrán volver como saldo de balance. Tener lista desde enero una cartera priorizada de proyectos permite incorporarlos y ejecutarlos sin perder meses.

6. Deuda y margen para pagar

AÑO	DEUDA TOTAL	FRENTE AL LÍMITE	INGRESO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	AHORRO EN CTA. CTE.
2023	S/ 40.6 M	17 %	S/ 251.5 M	S/ 182.0 M	S/ 69.5 M
2024	S/ 45.7 M	18 %	S/ 264.5 M	S/ 195.5 M	S/ 69.0 M
2025	S/ 67.0 M	26 %	S/ 279.1 M	S/ 251.9 M	S/ 27.2 M
2026*	S/ 69.4 M	26 %	S/ 196.6 M	S/ 118.8 M	S/ 77.8 M

Fuente: MEF, informes de reglas fiscales de gobiernos locales (evaluación anual 2023–2025; 2026* = seguimiento 2T2026). La deuda total no incluye beneficios sociales, pensiones ni juicios.

Según los informes anuales del MEF, la municipalidad cumplió las dos reglas fiscales en 2023, 2024 y 2025. El seguimiento de mitad de 2026 también las muestra cumplidas, sin adelantar el resultado del año. El registro de deuda del MEF (DGTP) no muestra préstamos, bonos ni otras deudas a su nombre al 31/05/2026. Eso no dice por sí solo cómo está en noviembre ni cuánto dinero tiene. La deuda total de las reglas fiscales subió de S/ 40.6 a S/ 67.0 millones (26 % de sus ingresos; el límite es 100 %). El detalle publicado no permite saber de qué se compone. En 2025 el gasto corriente subió 29 %, y el ingreso corriente, solo 6 %. Lo que sobra del ingreso corriente (no es caja) bajó de S/ 69.0 a S/ 27.2 millones. Hay menos margen para nuevos gastos permanentes (hipótesis que debe contrastarse con el flujo de caja de Tesorería).

> **Qué significa para usted.** Las reglas fiscales le dan margen de endeudamiento, pero el ahorro corriente viene bajando. Antes de crear plazas, contratos o servicios permanentes, compare su costo anual con ese ahorro.

7. Lo que estos datos no permiten saber y qué pedir

SEÑAL EN LOS DATOS	QUÉ PEDIR (RESPONSABLE PROPUESTO)	PRODUCTO VERIFICABLE
Saldo no devengado y saldo de balance	Saldos bancarios por fuente y conciliaciones (Tesorería y Contabilidad)	Conciliación al 31/12/2026
Proyectos con bajo avance financiero	Avance físico, valorizaciones y estado contractual (Obras)	Ficha por CUI con avance físico
Certificado no comprometido (S/ 10.8 M)	Estado de cada certificación (Abastecimiento)	Relación de certificaciones con su situación
Deuda sin detalle ni contingencias	Estado de situación financiera; sentencias, beneficios sociales y pensiones (Contabilidad, Procuraduría, RR. HH.)	Inventario de obligaciones con montos
Presupuesto 2027	PIA 2027 aprobado frente al PIA 2026 (S/ 301.2 M) y previsiones presupuestarias emitidas: CUI, monto y fuente (Presupuesto)	PIA 2027 por fuente y genérica; relación de previsiones

Anexo. Cómo se calcularon los escenarios de cierre 2026

MÉTODO (LOS 1 A 4 SE PROMEDIAN)	VALOR APLICADO	RESULTADO
1. Factor de cierre	×1.414 (promedio de ×1.358, ×1.484, ×1.401) sobre S/ 228.4 M	S/ 322.9 M
2. Gasto nov–dic como % del PIM	22.0 % × S/ 329.6 M	S/ 300.9 M
3. Gasto nov–dic como % de lo que faltaba	47.6 % × (PIM – devengado)	S/ 276.5 M
4. Ritmo de los tres últimos meses	S/ 22.3 M × 2	S/ 272.9 M
Escenario central	promedio de 1 a 4: 89.0 % del PIM	**S/ 293.3 M**
Rango de referencia	central -22.9 % / +32.8 % de lo que falta devengar: 82.0 % / 99.1 %	S/ 270.1 M / S/ 326.5 M

Cómo se calculó. Devengado ÷ PIM con el PIM vigente (2026) o final (años cerrados); referencia lineal = días transcurridos ÷ 365. El escenario central promedia cuatro métodos: fue el que menos se equivocó al probarlo en unas 1 900 municipalidades (2024–2025). El rango usa los percentiles 10 y 90 de esos errores. Este informe no reemplaza la auditoría ni el informe de transferencia.

ELABORADO POR
Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.

PLATAFORMA DE ANÁLISIS
KRONOS Gestión de Datos

Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com

Escanee para escribir por WhatsApp
