INFORME DETALLADO · MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA

Cómo recibe usted el presupuesto municipal

Lo que muestran los datos públicos del presupuesto 2023–2026, explicado para quien asumirá la alcaldía en enero.

Datos del MEF al 11/11/2026 · las cifras de 2026 son parciales

Antes de leer. Todo sale de lo que el MEF publica: presupuesto, gasto registrado (devengado) e ingresos registrados. Esos datos no muestran el avance físico de las obras, los contratos, el dinero en cuentas ni las deudas no registradas. Por eso aquí se separan los datos de las señales que conviene revisar; la última sección dice qué pedir.

1. Qué presupuesto hay y cuánto se ha ejecutado

AÑO	PIA	PIM	DEVENGADO	DEVENGADO ÷ PIM	NO DEVENGADO
2023	S/ 30.3 M	S/ 70.3 M	S/ 56.6 M	80.6 %	S/ 13.6 M
2024	S/ 39.9 M	S/ 59.9 M	S/ 44.6 M	74.4 %	S/ 15.3 M
2025	S/ 40.9 M	S/ 57.5 M	S/ 48.7 M	84.7 %	S/ 8.8 M
2026*	S/ 34.0 M	S/ 45.1 M	S/ 27.9 M	61.9 %	S/ 17.2 M

PIA: presupuesto de apertura · PIM: presupuesto modificado (final en 2023–2025, vigente en 2026) · Devengado: obligación de pago reconocida. *2026 al 11/11/2026.

En 2026 el presupuesto (PIM) es S/ 45.1 M: S/ 11.1 M más que al inicio del año (+33 %). Pero es mucho menor que en años anteriores: S/ 70.3 M en 2023 y S/ 57.5 M en 2025. Que un monto esté en el PIM no significa que el dinero haya llegado. En 2023–2025 gastó en promedio el 79.9 % de su presupuesto final. Cada año quedaron sin gastar unos S/ 12.6 millones.

Qué significa para usted. Recibe un presupuesto más chico que el de sus antecesores. Antes de prometer obras nuevas, conviene saber cuánto del PIA 2027 ya está comprometido.

2. Frente a los mismos meses de años anteriores


A fin de octubre de 2026 había gastado el **60.3 %** de su presupuesto. A la misma fecha de 2023–2025, el promedio fue **66.1 %** (55.6 %, 64.1 % y 78.6 %). 2026 va por debajo del promedio y muy por detrás de 2025. Pero parte del presupuesto es canon que no llegará (sección 5). Sin ese dinero, 2026 supera el promedio, aunque sigue detrás de 2025.

Frente a las demás municipalidades provinciales del departamento de Tumbes, a la misma fecha:

MUNICIPALIDAD	DEVENGADO ÷ PIM A FIN DE OCTUBRE	PROMEDIO 2023–2025
MP Zarumilla	60.3 %	79.9 %
MP Tumbes	52.8 %	70.9 %
MP Contralmirante Villar	44.1 %	75.0 %

Fuente: MEF, Datos Abiertos, mismo archivo para todas. Comparar no explica las causas.

Devengado acumulado como % del PIM, mes a mes

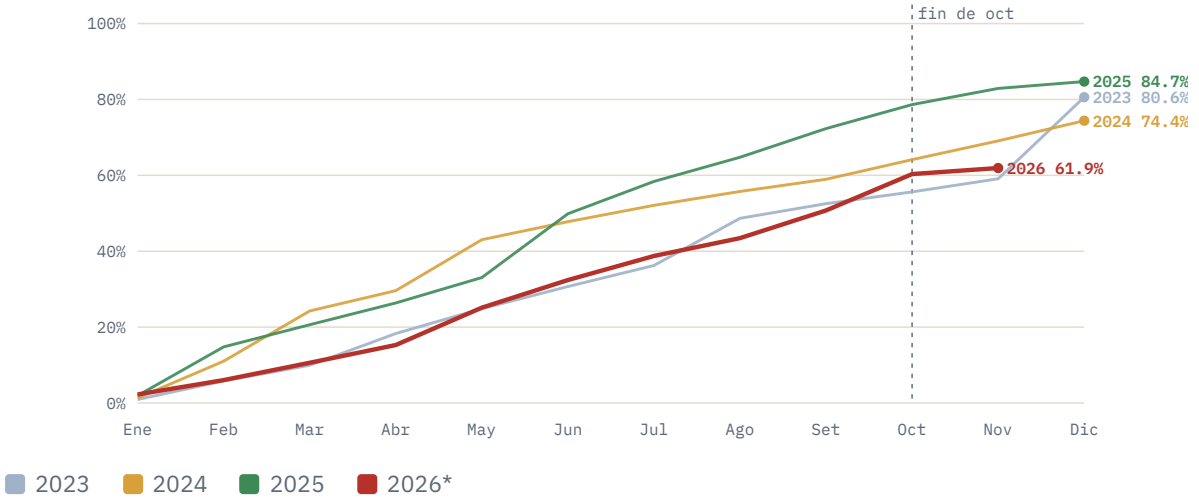

Fuente: MEF, Datos Abiertos. Años cerrados sobre su PIM final (comparación retrospectiva); 2026 sobre el PIM vigente.

Al 11/11/2026 va en 61.9 %. Si se gastara lo mismo cada día, llevaría 86.3 %; es solo una referencia, no una meta ni una programación oficial.

> **Qué significa para usted.** Si nada cambia, 2027 corre el riesgo de repetir el gasto concentrado a fin de año. Pida desde enero una programación mensual de gasto y de obras, y revísela cada mes.

3. Dónde se concentra el saldo

Faltan gastar S/ 17.2 M. De eso, S/ 11.9 M (69 %) son obras y equipos (genérica 2.6), que avanzan 40.8 %. A sus 40 proyectos les falta gastar S/ 11.8 M, y cinco concentran S/ 9.3 M (79 %). Ninguno es de prevención ante lluvias:

PROYECTO	PIM 2026	DEVENGADO ÷ PIM 2026	SALDO	OBRA AVANZADA (DECLARADO)
Mejoramiento del servicio vial y peatonal en el AA.HH. Las Flores del distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla - Tumbes CUI 2188398	S/ 5.0 M	37.3 %	S/ 3.1 M	59 % (gastado: 69 %)
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial y peatonal de la calle Loreto tramo entre la calle Ucayali y pasaje Los Tulipanes, calle Sucre tramo entre la calle Ucayali y calle Lizardo Montero, calle Los Geranios tramo entre la calle Santa Rosa y calle Los Libertadores, calle Carlos Otiniano tramo ente la calle Ucayali y pasaje Zarumilla, pasaje Zarumilla, pasaje s/n, pasaje Los Tulipanes, pasaje Las Begonias del distrito de Zarumilla - provincia de Zarumilla - departamento de Tumbes CUI 2494410	S/ 1.7 M	0.0 %	S/ 1.7 M	0 % (gastado: 8 %)
Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el coliseo deportivo del AA.HH. Miraflores del distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes CUI 2620384	S/ 1.7 M	2.0 %	S/ 1.6 M	sin registro
Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el complejo deportivo de las intersecciones de la calle Libertadores y el pasaje Tulipanes del AA.HH. Héroes del Cenepa del distrito de Zarumilla de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes CUI 2629450	S/ 1.5 M	0.0 %	S/ 1.5 M	sin registro
Mejoramiento del camino vecinal ruta TU-514 El Pasayo del distrito de Papayal - provincia de Zarumilla - departamento de Tumbes CUI 2552545	S/ 3.2 M	57.4 %	S/ 1.4 M	47 % (gastado: 58 %)

Obra avanzada: la declara la municipalidad en el Formato N.° 12-B del MEF (al 12/11/2026). Entre paréntesis, lo gastado de su costo total en todos los años.

El porcentaje es avance financiero del año, no avance físico; un 0 % no prueba que la obra no haya empezado. El PIM anual no es el costo total del proyecto.

El 85.9 % del presupuesto ya está certificado, es decir, reservado para gastarse este año (art. 41.1 del D. Leg. 1440). Lo que un contrato deba pagar en 2027 o después necesita una previsión presupuestaria (art. 41.4). Esa previsión debe ajustarse a la programación multianual y a lo que se puede financiar (Oficio Circular N.° 0035-2026-EF/50.07). Hay S/ 5.6 M reservados que todavía no tienen un contrato registrado. El dato no dice si hay contratos o procesos en marcha: hay que preguntarlo.

> **Qué significa para usted.** Estos proyectos marcarán su primer mes. Para decidir si siguen, se reprograman o se revisan, necesitará el expediente, el contrato y el avance físico de cada uno.

4. Cómo cambian los ingresos

En el PIM 2026 pesan: canon y sobrecanon 39 %, FONCOMUN 32 %, recursos ordinarios 12 %, operaciones de crédito 11 %, impuestos municipales 4 %, recursos directamente recaudados 3 %, donaciones y transferencias 1 %. Los recursos propios son solo el 6 % del PIM. Lo que entró de enero a octubre de cada año (sin saldos de balance):

- **Canon y sobrecanon:** S/ 8.7 M, 28 % menos que en 2025 y 41 % menos que en 2023. Es la principal fuente de la municipalidad.
- **Ingresos propios:** S/ 1.4 M, 16 % menos que en 2025. Predial: S/ 0.5 M (2025: S/ 0.7 M).
- **FONCOMUN:** S/ 9.6 M, 25 % más que en 2025; compensa solo en parte la caída del canon.

Los créditos suman S/ 5.0 M en el presupuesto, todo en bonos del Tesoro. Ya se gastaron S/ 1.6 M, sobre todo en la vía del A.H. Las Flores.

Saldo de balance (dinero de años anteriores que no se gastó): en 2026 se presupuestaron S/ 2.6 M y se registraron S/ 1.3 M. En 2023 se habían registrado S/ 14.6 M. La municipalidad llega a 2026 con mucho menos dinero de años anteriores. Cuánto hay de verdad solo lo dicen los saldos bancarios.

> **Qué significa para usted.** El canon, su principal ingreso, viene cayendo. No asuma gasto permanente contando con que se recupere.

5. Escenarios de cierre 2026

ESCENARIO	EJECUCIÓN AL CIERRE	SIN DEVENGAR
Menor ejecución	65.8 %	S/ 15.4 M
Central	**73.1 %**	**S/ 12.1 M**
Mayor ejecución	83.7 %	S/ 7.4 M

Cómo se calcula cada escenario: ver el anexo al final.

Si noviembre y diciembre se parecen a 2023–2025, el año cerraría en **73.1 %**. Quedarían **S/ 12.1 millones** sin gastar. El rango de referencia va de 65.8 % a 83.7 %. El cálculo suma aparte los S/ 1.6 M ya devengados con bonos del Tesoro, que siguen el cronograma de la obra. Son escenarios, no pronósticos, y suponen que el PIM no cambia. Para gastar todo el PIM harían falta S/ 10.4 M por mes, frente a un promedio mensual de S/ 2.7 M en el año.

Prueba con años pasados. Si este método se hubiera usado a fin de octubre, habría anticipado 84.6 % para 2024 (cerró en 74.4 %) y 94.0 % para 2025 (cerró en 84.7 %). Se habría equivocado en 10.2 y 9.3 puntos. El cierre real quedó fuera del rango en 2 de 2 casos. Los escenarios son referencias, no límites.

¿Saldo real o presupuesto sin sincerar? El MEF estimó para 2026 S/ 11.2 M de canon y sobrecanon (Comunicado N.° 0018-2026-EF/50.01, 27/10/2026); el PIM mantiene S/ 16.4 M. En total, unos **S/ 7.6 M** del presupuesto 2026 no llegarían este año. Es el 63 % del saldo sin gastar del escenario central. Esa parte no es dinero sin gastar: es presupuesto que no se ajustó a los ingresos reales. Además, S/ 1.4 M de saldo de balance presupuestado aún no figuran como ingreso registrado. La diferencia crece cada año. Lo que quedó sin recaudar al cierre fue 2023: S/ 0.2 M; 2024: S/ 2.0 M; 2025: S/ 5.4 M. Si se quita ese dinero de la cuenta, a fin de octubre de 2026 se habría gastado 73 de cada 100 soles (87 en 2025, con el mismo ajuste). La Ley 32732 permitió reducir el presupuesto con las estimaciones del MEF. Conviene revisar el presupuesto actual y preparar el de 2027 con esas estimaciones.

> **Qué significa para usted.** En el escenario central quedarían unos S/ 12.1 millones sin devengar. Una parte podría volver en 2027 como saldo de balance, pero solo si el dinero está en las cuentas. El canon que no llegue no volverá. Confírmelo con Tesorería.

6. Deuda y margen para pagar

AÑO	DEUDA TOTAL	FRENTE AL LÍMITE	INGRESO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	AHORRO EN CTA. CTE.
2023	S/ 18.1 M	39 %	S/ 30.8 M	S/ 22.7 M	S/ 8.1 M
2024	S/ 74.4 M	147 %	S/ 29.1 M	S/ 23.3 M	S/ 5.8 M
2025	S/ 84.5 M	179 %	S/ 26.4 M	S/ 18.9 M	S/ 7.5 M
2026*	S/ 85.4 M	196 %	S/ 9.4 M	S/ 10.3 M	S/ -0.8 M

Fuente: MEF, informes de reglas fiscales de gobiernos locales (evaluación anual 2023–2025; 2026* = seguimiento 2T2026). La deuda total no incluye beneficios sociales, pensiones ni juicios.

Según los informes anuales del MEF, la municipalidad cumplió las dos reglas fiscales en 2023. Desde 2024 no cumple la de deuda. Su deuda pasó de S/ 18.1 millones a S/ 74.4 millones en un año, y llegó a S/ 84.5 millones en 2025. Eso es el 179 % de sus ingresos corrientes promedio; el límite es 100 %. Con deudas a marzo de 2026, sube a S/ 85.4 millones. Y, por primera vez, tampoco cumple la regla de ahorro; el resultado del año se sabrá cuando el MEF evalúe 2026. El registro de deuda del MEF (DGTP) solo muestra S/ 11.1 M al 31/05/2026, en dos créditos por CIPRL, por vencer y sin atraso. El MEF no publica qué es el resto. El salto de 2024 podría deberse a deudas reconocidas al cierre contable (hipótesis); solo los estados financieros pueden aclararlo. No cumplir la regla de deuda puede limitar nuevos préstamos y obligar a un compromiso de ajuste, a confirmar con el MEF.

> **Qué significa para usted.** Este es el punto más delicado de la transferencia: la municipalidad incumple la regla de deuda y no se sabe de qué se compone. Deje constancia en el acta de lo que recibe y pida el detalle antes de asumir pagos nuevos.

7. El condicionante de las lluvias

Hay que separar cuatro cosas. El **fenómeno**: el ENFEN (comunicado N.° 19-2026, 30/10/2026) prevé un Niño costero extraordinario hasta febrero de 2027, medido por la temperatura del mar. Las **lluvias**: se pronostican sobre lo normal en la costa norte, sin un pronóstico específico para la provincia. La **emergencia**: en 2026 la provincia tuvo una declaratoria por lluvias tras otra (D.S. N.° 097, 124 y 149-2026-PCM). La vigente es el D.S. N.° 149-2026-PCM (03/11/2026, 60 días, nivel 4). Incluye los cuatro distritos y vence alrededor del 1 de enero de 2027. Los **daños**: el 1 y 2 de noviembre el río Zarumilla se desbordó en Aguas Verdes y Papayal. Aun así, la partida de emergencia (5006144) no tiene presupuesto en 2026. En 2023 tuvo S/ 4.1 M y en 2024, S/ 4.5 M, y casi todo se gastó. El mantenimiento de cauces y drenajes bajó de S/ 82 400 en el PIA a S/ 6 000.

> **Qué significa para usted.** La temporada más fuerte de lluvias coincidirá con sus primeras semanas. Sin declaratoria vigente, registros del SINPAD al día y la actividad de emergencia habilitada, no podrá pagar la respuesta con rapidez.

8. Lo que estos datos no permiten saber y qué pedir

SEÑAL EN LOS DATOS	QUÉ PEDIR (RESPONSABLE PROPUESTO)	PRODUCTO VERIFICABLE
Saldo no devengado y saldo de balance	Saldos bancarios por fuente y conciliaciones (Tesorería y Contabilidad)	Conciliación al 31/12/2026
Proyectos con bajo avance financiero	Avance físico, valorizaciones y estado contractual (Obras)	Ficha por CUI con avance físico
Certificado no comprometido (S/ 5.6 M)	Estado de cada certificación (Abastecimiento)	Relación de certificaciones con su situación
CIPRL y bonos del Tesoro	Convenio, cronograma de repago y norma de incorporación (Gerencia Municipal y Presupuesto)	Expediente del financiamiento
Deuda de S/ 84.5 M sin detalle	Estados financieros con notas; composición de la deuda usada en la regla fiscal; cronograma de los CIPRL (Contabilidad, Presupuesto, DGTP)	Inventario de obligaciones con acreedor, monto y vencimiento
Contingencias	Sentencias en ejecución, beneficios sociales y pensiones (Procuraduría y RR. HH.)	Relación con montos y fechas
Emergencia por lluvias	Decreto vigente y su anexo, plan ante lluvias, registros SINPAD y requisitos FONDES (Gestión del Riesgo)	Vigencia confirmada; plan aprobado
Presupuesto 2027	PIA 2027 aprobado frente al PIA 2026 (S/ 34.0 M) y previsiones presupuestarias emitidas: CUI, monto y fuente (Presupuesto)	PIA 2027 por fuente y genérica; relación de previsiones

Anexo. Cómo se calcularon los escenarios de cierre 2026

MÉTODO (LOS 1 A 4 SE PROMEDIAN)	VALOR APLICADO	RESULTADO
1. Factor de cierre	×1.229 (promedio de ×1.449, ×1.144, ×1.093) sobre S/ 25.6 M	S/ 33.0 M
2. Gasto nov–dic como % del PIM	14.4 % × S/ 40.1 M	S/ 33.0 M
3. Gasto nov–dic como % de lo que faltaba	41.8 % × (PIM – devengado)	S/ 33.2 M
4. Ritmo de los tres últimos meses	S/ 2.7 M × 2	S/ 32.6 M
Escenario central	promedio de 1 a 4 (incluye S/ 1.6 M de crédito): 73.1 % del PIM	**S/ 33.0 M**
Rango de referencia	central -22.9 % / +32.8 % de lo que falta devengar: 65.8 % / 83.7 %	S/ 29.6 M / S/ 37.7 M

Cómo se calculó. Devengado ÷ PIM con el PIM vigente (2026) o final (años cerrados); referencia lineal = días transcurridos ÷ 365. El escenario central promedia cuatro métodos: fue el que menos se equivocó al probarlo en unas 1 900 municipalidades (2024–2025). El rango usa los percentiles 10 y 90 de esos errores. El rubro 19 (CIPRL y bonos) queda fuera de los métodos: se suma lo ya devengado al corte (S/ 1.6 M). Este informe no reemplaza la auditoría ni el informe de transferencia.

ELABORADO POR
Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.

PLATAFORMA DE ANÁLISIS
KRONOS Gestión de Datos — Para la toma de decisiones

Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com

Escanee para escribir por WhatsApp
