INFORME DETALLADO · MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ÓRGANOS

Cómo recibe usted el presupuesto municipal

Lo que muestran los datos públicos del presupuesto 2023–2026, explicado para quien asumirá la alcaldía en enero.

Datos del MEF al 11/11/2026 · las cifras de 2026 son parciales

Antes de leer. Todo sale de lo que el MEF publica: presupuesto, gasto registrado (devengado) e ingresos registrados. Esos datos no muestran el avance físico de las obras, los contratos, el dinero en cuentas ni las deudas no registradas. Por eso aquí se separan los datos de las señales que conviene revisar; la última sección dice qué pedir.

1. Qué presupuesto hay y cuánto se ha ejecutado

AÑO	PIA	PIM	DEVENGADO	DEVENGADO ÷ PIM	NO DEVENGADO
2023	S/ 12.8 M	S/ 32.7 M	S/ 27.9 M	85.6 %	S/ 4.7 M
2024	S/ 25.8 M	S/ 39.0 M	S/ 28.2 M	72.4 %	S/ 10.8 M
2025	S/ 12.8 M	S/ 34.9 M	S/ 14.1 M	40.4 %	S/ 20.8 M
2026*	S/ 14.7 M	S/ 37.7 M	S/ 24.1 M	64.0 %	S/ 13.6 M

PIA: presupuesto de apertura · PIM: presupuesto modificado (final en 2023–2025, vigente en 2026) · Devengado: obligación de pago reconocida. *2026 al 11/11/2026.

En 2026 el presupuesto (PIM) es S/ 37.7 M: S/ 23.0 M más que al inicio del año (+157 %). Buena parte de ese aumento es saldo de balance: la transferencia para el malecón turístico que llegó en 2025 y no se gastó ese año. En 2023–2025 se devengó en promedio el 66.1 % del PIM final, pero con mucha diferencia entre años: 85.6 % en 2023, 72.4 % en 2024, 40.4 % en 2025.

Qué significa para usted. Una sola obra puede mover la ejecución de todo el año. Pida la lista de obras grandes con su fuente y su cronograma antes de evaluar cómo va el gasto.

2. Frente a los mismos meses de años anteriores


A fin de octubre de 2026 había gastado el **62.6 %** de su presupuesto. A la misma fecha de 2023–2025, el promedio fue **53.3 %** (62.1 %, 54.7 % y 43.1 %). 2026 va mejor que esos años, y la razón principal es una sola obra: el malecón turístico, con S/ 12.9 M devengados en 2026. Sin ella, el resto del presupuesto iría en 50.5 % al 11/11/2026.

Frente a las demás municipalidades distritales de la provincia de Talara, a la misma fecha:

MUNICIPALIDAD	DEVENGADO ÷ PIM A FIN DE OCTUBRE	PROMEDIO 2023–2025
MD Máncora	72.3 %	70.0 %
MD Los Órganos	62.6 %	66.1 %
MD La Brea	59.6 %	71.5 %
MD El Alto	49.6 %	70.5 %
MD Lobitos	45.1 %	55.8 %

Fuente: MEF, Datos Abiertos, mismo archivo para todas. Comparar no explica las causas.

Devengado acumulado como % del PIM, mes a mes

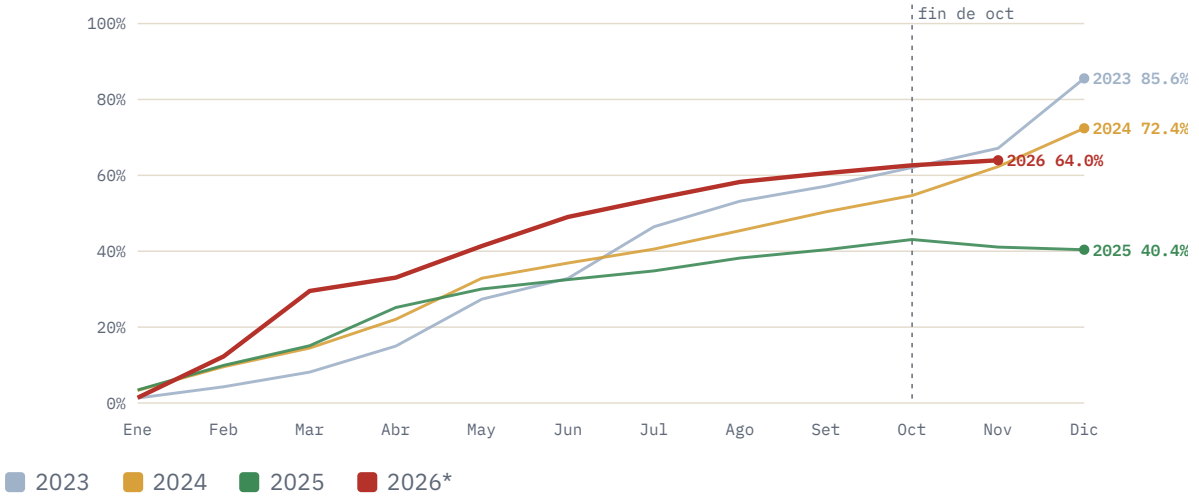

Fuente: MEF, Datos Abiertos. Años cerrados sobre su PIM final (comparación retrospectiva); 2026 sobre el PIM vigente.

Al 11/11/2026 va en 64.0 %. Si se gastara lo mismo cada día, llevaría 86.3 %; es solo una referencia, no una meta ni una programación oficial.

> **Qué significa para usted.** Si nada cambia, 2027 dependerá otra vez de una o dos obras. Pida desde enero una programación mensual de gasto y de obras, y revísela cada mes.

3. Dónde se concentra el saldo

De los S/ 13.6 M que faltan devengar, S/ 9.9 M (73 %) son obras y equipos (genérica 2.6). Los 23 proyectos con CUI tienen S/ 9.8 M por devengar, y cinco concentran S/ 8.5 M (86 %). El de mayor saldo, la rehabilitación del colegio 14915, casi no ha empezado:

PROYECTO	PIM 2026	DEVENGADO ÷ PIM 2026	SALDO	OBRA AVANZADA (DECLARADO)
Rehabilitación del local escolar 14915 con código local 439661, institución educativa primaria Divino Cristo Rey del distrito Los Órganos, provincia de Talara - departamento de Piura CUI 2533732	S/ 2.7 M	1.1 %	S/ 2.7 M	sin registro
Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos en el malecón turístico Los Órganos del distrito de Los Órganos - provincia de Talara - departamento de Piura CUI 2618985	S/ 15.5 M	83.4 %	S/ 2.6 M	37 % (gastado: 49 %)
Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del asentamiento humano Puerto Antiguo mz. f1, i, j1, j2, n, pasaje San Carlos y San Jorge, distrito de Los Órganos - provincia de Talara - departamento de Piura CUI 2543691	S/ 1.2 M	0.0 %	S/ 1.2 M	sin registro
Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el asentamiento humano José Peña Quiroga del distrito de Los Órganos - provincia de Talara - departamento de Piura CUI 2609291	S/ 1.1 M	0.0 %	S/ 1.1 M	0 % (gastado: 1 %)
Creación de los servicios públicos de integración económica y social en la alameda ubicada en la Av. Panamericana al frente del Grupo Aéreo Los Órganos del distrito de Los Órganos de la provincia de Talara del departamento de Piura CUI 2587183	S/ 0.9 M	0.0 %	S/ 0.9 M	sin registro

Obra avanzada: la declara la municipalidad en el Formato N.° 12-B del MEF (al 12/11/2026). Entre paréntesis, lo gastado de su costo total en todos los años.

El porcentaje es avance financiero del año, no avance físico; un 0 % no prueba que la obra no haya empezado. El PIM anual no es el costo total del proyecto.

El 84.1 % del presupuesto ya está certificado, es decir, reservado para gastarse este año (art. 41.1 del D. Leg. 1440). Lo que un contrato deba pagar en 2027 o después necesita una previsión presupuestaria (art. 41.4). Esa previsión debe ajustarse a la programación multianual y a lo que se puede financiar (Oficio Circular N.° 0035-2026-EF/50.07). Hay S/ 3.4 M reservados que todavía no tienen un contrato registrado. El dato no dice si hay contratos o procesos en marcha: hay que preguntarlo.

> **Qué significa para usted.** Estos proyectos marcarán su primer mes. Para decidir si siguen, se reprograman o se revisan, necesitará el expediente, el contrato y el avance físico de cada uno.

4. Cómo cambian los ingresos

En el PIM 2026 pesan: donaciones y transferencias 38 %, canon y sobrecanon 27 %, impuestos municipales 8 %, recursos ordinarios 7 %, operaciones de crédito 7 %, FONCOMUN 7 %, recursos directamente recaudados 6 %. El primer rubro es sobre todo el saldo de la transferencia del malecón. Los recursos propios son el 14 % del PIM. Lo que entró de enero a octubre de cada año (sin saldos de balance):

- **Canon y sobrecanon:** S/ 4.3 M, 11 % menos que en 2025 y 47 % menos que en 2023.
- **Ingresos propios:** S/ 3.7 M, 36 % más que en 2025. El predial subió a S/ 2.1 M (2025: S/ 1.5 M): es la buena noticia de los ingresos.
- **FONCOMUN:** S/ 1.6 M, 19 % más que en 2025.

Las operaciones de crédito suman S/ 2.7 M de PIM en bonos del Tesoro, casi sin devengado al corte (S/ 29 800).

Saldo de balance (dinero de años anteriores que no se gastó): en 2026 se presupuestaron S/ 16.4 M y se registraron S/ 14.3 M. Cuánto hay en las cuentas solo lo dicen los saldos bancarios. (Diferencias de años anteriores: 2023: –S/ 3.1 M; 2024: S/ 1.4 M; 2025: S/ 2.6 M.)

> **Qué significa para usted.** El canon baja, pero el predial sube. Cuidar la recaudación propia es la palanca que depende de usted.

5. Escenarios de cierre 2026

ESCENARIO	EJECUCIÓN AL CIERRE	SIN DEVENGAR
Menor ejecución	65.1 %	S/ 13.1 M
Central	**73.7 %**	**S/ 9.9 M**
Mayor ejecución	85.9 %	S/ 5.3 M

Cómo se calcula cada escenario: ver el anexo al final.

Si noviembre y diciembre se parecen a 2023–2025, el año cerraría en **73.7 %**. Quedarían **S/ 9.9 millones** sin gastar. El rango de referencia va de 65.1 % a 85.9 %. Son escenarios, no pronósticos, y suponen que el PIM no cambia. Para gastar todo el PIM harían falta S/ 8.3 M por mes, frente a un promedio mensual de S/ 2.4 M en el año.

Prueba con años pasados. Si este método se hubiera usado a fin de octubre, habría anticipado 75.1 % para 2024 (cerró en 72.4 %) y 60.6 % para 2025 (cerró en 40.4 %). Se habría equivocado en 2.7 y 20.2 puntos. El cierre real quedó fuera del rango en 1 de 2 casos. Los escenarios son referencias, no límites.

¿Saldo real o presupuesto sin sincerar? El MEF estimó para 2026 S/ 5.5 M de canon y sobrecanon (Comunicado N.° 0018-2026-EF/50.01, 27/10/2026); el PIM mantiene S/ 8.4 M. En total, unos **S/ 3.9 M** del presupuesto 2026 no llegarían este año. Es el 39 % del saldo sin gastar del escenario central. Esa parte no es dinero sin gastar: es presupuesto que no se ajustó a los ingresos reales. Además, S/ 2.1 M de saldo de balance presupuestado aún no figuran como ingreso registrado. En años anteriores también quedaron ingresos sin recaudar al cierre: 2023: S/ 0.4 M; 2024: S/ 2.0 M; 2025: S/ 3.9 M. Si se quita ese dinero de la cuenta, a fin de octubre de 2026 se habría gastado 70 de cada 100 soles (48 en 2025, con el mismo ajuste). La Ley 32732 permitió reducir el presupuesto con las estimaciones del MEF. Conviene revisar el presupuesto actual y preparar el de 2027 con esas estimaciones.

> **Qué significa para usted.** En el escenario central quedarían unos S/ 9.9 millones sin devengar. Una parte podría volver en 2027 como saldo de balance, pero solo si el dinero está en las cuentas. El canon que no llegue no volverá. Confírmelo con Tesorería.

6. Deuda y margen para pagar

AÑO	DEUDA TOTAL	FRENTE AL LÍMITE	INGRESO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	AHORRO EN CTA. CTE.
2023	S/ 8.6 M	30 %	S/ 14.5 M	S/ 9.3 M	S/ 5.2 M
2024	S/ 9.7 M	33 %	S/ 13.1 M	S/ 8.3 M	S/ 4.8 M
2025	S/ 10.4 M	42 %	S/ 10.0 M	S/ 7.7 M	S/ 2.3 M
2026*	S/ 11.6 M	52 %	S/ 8.3 M	S/ 5.7 M	S/ 2.6 M

Fuente: MEF, informes de reglas fiscales de gobiernos locales (evaluación anual 2023–2025; 2026* = seguimiento 2T2026). La deuda total no incluye beneficios sociales, pensiones ni juicios.

Según los informes anuales del MEF, la municipalidad cumplió las dos reglas fiscales en 2023, 2024 y 2025. El seguimiento de mitad de 2026 también las muestra cumplidas, sin adelantar el resultado del año. El registro de deuda del MEF (DGTP) no muestra préstamos ni bonos a su nombre al 31/05/2026. Máncora, en cambio, registra S/ 10.1 M en CIPRL. Pero el margen se achica. La deuda total subió de S/ 8.6 a S/ 10.4 millones; a mitad de 2026 llega al 52 % de sus ingresos corrientes promedio. Mientras tanto, el ingreso corriente bajó de S/ 14.5 a S/ 10.0 millones. Y lo que sobra del ingreso corriente (no es caja) bajó de S/ 5.2 a S/ 2.3 millones. La caída del canon podría explicar buena parte de esa tendencia (hipótesis).

> **Qué significa para usted.** Las reglas fiscales se cumplen, pero con menos margen cada año. Pida el flujo de caja antes de comprometer pagos nuevos.

7. El condicionante de las lluvias

Hay que separar cuatro cosas. El **fenómeno**: el ENFEN (comunicado N.° 19-2026, 30/10/2026) prevé un Niño costero extraordinario hasta febrero de 2027, medido por la temperatura del mar. Las **lluvias**: se pronostican sobre lo normal en la costa norte, sin un pronóstico específico para el distrito. En febrero de 2026 ya afectaron el agua en Máncora y Los Órganos. La **emergencia**: en 2026 Talara tuvo una declaratoria por lluvias tras otra (D.S. N.° 025, 097, 124 y 149-2026-PCM). La vigente es el D.S. N.° 149-2026-PCM (03/11/2026, 60 días, nivel 4). Incluye los seis distritos y vence alrededor del 1 de enero de 2027. Los **recursos**: la actividad de emergencia (5006144) tiene S/ 0.8 M de PIM en 2026 y va en 13 %; en 2025 se devengó el 36 %. No hay presupuesto para kits de ayuda humanitaria.

> **Qué significa para usted.** La temporada fuerte de lluvias coincidirá con sus primeras semanas. Tener la actividad de emergencia habilitada no basta: hace falta ejecutarla rápido y con los daños registrados en el SINPAD.

8. Lo que estos datos no permiten saber y qué pedir

SEÑAL EN LOS DATOS	QUÉ PEDIR (RESPONSABLE PROPUESTO)	PRODUCTO VERIFICABLE
Saldo no devengado y saldo de balance	Saldos bancarios por fuente y conciliaciones (Tesorería y Contabilidad)	Conciliación al 31/12/2026

SEÑAL EN LOS DATOS	QUÉ PEDIR (RESPONSABLE PROPUESTO)	PRODUCTO VERIFICABLE
Proyectos con bajo avance financiero	Avance físico, valorizaciones y estado contractual (Obras)	Ficha por CUI con avance físico
Certificado no comprometido (S/ 3.4 M)	Estado de cada certificación (Abastecimiento)	Relación de certificaciones con su situación
CIPRL y bonos del Tesoro	Convenio, cronograma de repago y norma de incorporación (Gerencia Municipal y Presupuesto)	Expediente del financiamiento
Deuda sin detalle ni contingencias	Estado de situación financiera; sentencias, beneficios sociales y pensiones (Contabilidad, Procuraduría, RR. HH.)	Inventario de obligaciones con montos
Emergencia por lluvias	Decreto vigente y su anexo, plan ante lluvias, registros SINPAD y requisitos FONDES (Gestión del Riesgo)	Vigencia confirmada; plan aprobado
Presupuesto 2027	PIA 2027 aprobado frente al PIA 2026 (S/ 14.7 M) y previsiones presupuestarias emitidas: CUI, monto y fuente (Presupuesto)	PIA 2027 por fuente y genérica; relación de previsiones

Anexo. Cómo se calcularon los escenarios de cierre 2026

MÉTODO (LOS 1 A 4 SE PROMEDIAN)	VALOR APLICADO	RESULTADO
1. Factor de cierre	×1.213 (promedio de ×1.378, ×1.324, ×0.938) sobre S/ 23.6 M	S/ 28.7 M
2. Gasto nov–dic como % del PIM	12.8 % × S/ 37.7 M	S/ 28.5 M
3. Gasto nov–dic como % de lo que faltaba	32.1 % × (PIM – devengado)	S/ 28.1 M
4. Ritmo de los tres últimos meses	S/ 1.1 M × 2	S/ 25.8 M
Escenario central	promedio de 1 a 4: 73.7 % del PIM	**S/ 27.8 M**
Rango de referencia	central -22.9 % / +32.8 % de lo que falta devengar: 65.1 % / 85.9 %	S/ 24.5 M / S/ 32.4 M

Cómo se calculó. Devengado ÷ PIM con el PIM vigente (2026) o final (años cerrados); referencia lineal = días transcurridos ÷ 365. El escenario central promedia cuatro métodos: fue el que menos se equivocó al probarlo en unas 1 900 municipalidades (2024–2025). El rango usa los percentiles 10 y 90 de esos errores. Este informe no reemplaza la auditoría ni el informe de transferencia.

ELABORADO POR
Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.

PLATAFORMA DE ANÁLISIS
KRONOS Gestión de Datos

Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com

Escanee para escribir por WhatsApp
