INFORME DETALLADO · MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES

Cómo recibe usted el presupuesto municipal

Lo que muestran los datos públicos del presupuesto 2023–2026, explicado para quien asumirá la alcaldía en enero.

Datos del MEF al 11/11/2026 · las cifras de 2026 son parciales

Antes de leer. Todo sale de lo que el MEF publica: presupuesto, gasto registrado (devengado) e ingresos registrados. Esos datos no muestran el avance físico de las obras, los contratos, el dinero en cuentas ni las deudas no registradas. Por eso aquí se separan los datos de las señales que conviene revisar; la última sección dice qué pedir.

1. Qué presupuesto hay y cuánto se ha ejecutado

AÑO	PIA	PIM	DEVENGADO	DEVENGADO ÷ PIM	NO DEVENGADO
2023	S/ 17.8 M	S/ 28.1 M	S/ 19.4 M	69.2 %	S/ 8.7 M
2024	S/ 25.8 M	S/ 31.7 M	S/ 25.9 M	81.5 %	S/ 5.9 M
2025	S/ 21.8 M	S/ 35.5 M	S/ 31.8 M	89.5 %	S/ 3.7 M
2026*	S/ 22.3 M	S/ 27.6 M	S/ 13.6 M	49.4 %	S/ 14.0 M

PIA: presupuesto de apertura · PIM: presupuesto modificado (final en 2023–2025, vigente en 2026) · Devengado: obligación de pago reconocida. *2026 al 11/11/2026.

En 2026 el PIM es S/ 27.6 M, S/ 5.4 M más que el PIA (+24 %), pero menos que en los dos años anteriores: S/ 31.7 M en 2024 y S/ 35.5 M en 2025. Que un monto esté en el PIM no significa que el dinero haya llegado. En 2023–2025 se devengó en promedio el 80.1 % del PIM final y quedaron sin gastar S/ 6.1 millones por año.

Qué significa para usted. Recibe un presupuesto más chico que el de 2025. Antes de prometer obras nuevas, conviene saber cuánto del PIA 2027 ya está comprometido.

2. Frente a los mismos meses de años anteriores


A fin de octubre de 2026 se había devengado el **48.4 %** del PIM. En 2023–2025, a la misma fecha, el promedio fue **67.3 %** (54.8 %, 63.8 % y 83.2 %). Es el avance más bajo de los cuatro años a esta altura, y 2025 fue el que más avanzó.

Frente a las demás municipalidades distritales de la provincia de Zarumilla, a la misma fecha:

MUNICIPALIDAD	DEVENGADO ÷ PIM A FIN DE OCTUBRE	PROMEDIO 2023–2025
MD Papayal	83.4 %	72.5 %
MD Matapalo	60.5 %	85.9 %
MD Aguas Verdes	48.4 %	80.1 %

Fuente: MEF, Datos Abiertos, mismo archivo para todas. Comparar no explica las causas.

Devengado acumulado como % del PIM, mes a mes

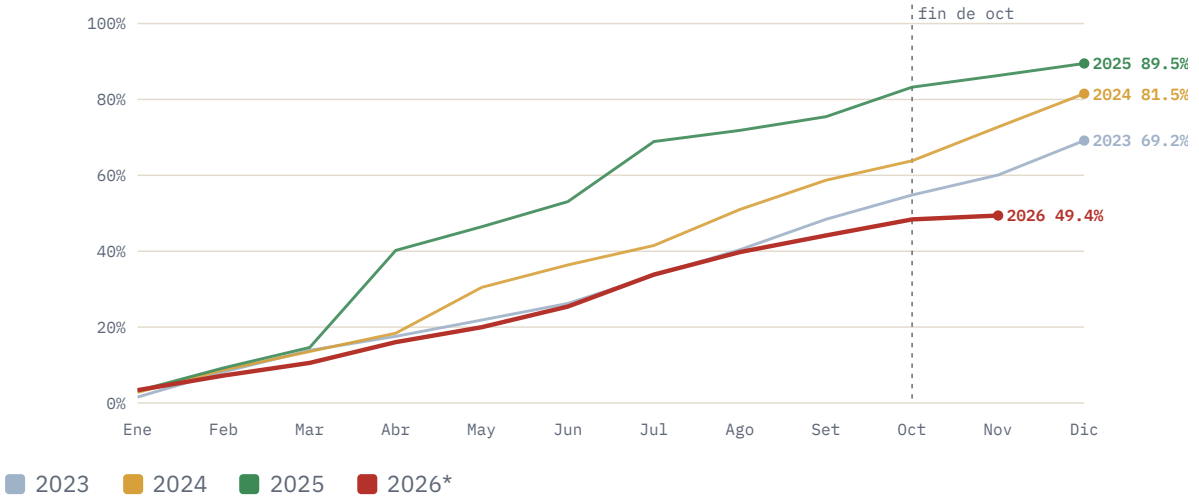

Fuente: MEF, Datos Abiertos. Años cerrados sobre su PIM final (comparación retrospectiva); 2026 sobre el PIM vigente.

Al 11/11/2026 va en 49.4 %. Si se gastara lo mismo cada día, llevaría 86.3 %; esa referencia lineal solo da un orden de magnitud, no es una meta ni una programación oficial.

> **Qué significa para usted.** 2026 se frenó: si nada cambia, la gestión saliente cerraría con más saldo sin gastar que en los años anteriores. Pida desde enero una programación mensual de gasto y de obras, y revísela cada mes.

3. Dónde se concentra el saldo

De los S/ 14.0 M que faltan devengar, S/ 8.7 M (62 %) son obras y equipos (genérica 2.6), donde el avance es de 30.2 %. Los 20 proyectos con CUI tienen S/ 8.5 M por devengar, y cinco concentran S/ 7.3 M (86 %). El mayor saldo es la seguridad ciudadana local, financiada con CIPRL de Obras por Impuestos y sin certificar al corte; en 2026 la provincia también estuvo en emergencia por criminalidad (D.S. N.° 045-2026-PCM y sus prórrogas). Ninguno de los cinco es de prevención ante lluvias:

PROYECTO	PIM 2026	DEVENGADO ÷ PIM 2026	SALDO
Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana local en municipalidad distrital de Aguas Verdes distrito de Aguas Verdes de la provincia de zarumilla del departamento de tumbes CUI 2621453	S/ 3.3 M	0.0 %	S/ 3.3 M
Creacion del servicio de practica deportiva y/o recreativa en el polideportivo de la i etapa del aa.hh villa primavera distrito de Aguas Verdes - provincia de zarumilla - departamento de tumbes CUI 2612068	S/ 2.2 M	12.4 %	S/ 2.0 M
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial y peatonal en el aa.hh. complejo habitacional, distrito de Aguas Verdes, provincia de zarumilla - tumbes CUI 2398234	S/ 1.0 M	0.0 %	S/ 1.0 M
Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en el asentamiento humano ampliacion alberto fujimori fujimori del distrito de Aguas Verdes de la provincia de zarumilla del departamento de tumbes CUI 2704664	S/ 2.0 M	62.6 %	S/ 0.7 M
Construccion de pavimento y veredas asentamiento humano nuevo Aguas Verdes, distrito de Aguas Verdes - zarumilla - tumbes CUI 2087247	S/ 1.6 M	76.5 %	S/ 0.4 M

El porcentaje es avance financiero del año, no avance físico; un 0 % no prueba que la obra no haya empezado. El PIM anual no es el costo total del proyecto.

El 72.6 % del PIM ya está certificado: tiene crédito disponible para comprometerse este año (art. 41.1 del D. Leg. 1440). Lo que un contrato deba pagar en 2027 o después requiere una previsión presupuestaria (art. 41.4), ajustada a la programación multianual y a la capacidad de financiamiento (Oficio Circular N.° 0035-2026-EF/50.07). Hay S/ 5.1 M certificados que todavía no tienen compromiso registrado; el mayor monto (S/ 1.8 millones) está en el polideportivo de Villa Primavera. El dato no dice si hay contratos o procesos en marcha: es algo que hay que preguntar, no una causa probada.

> **Qué significa para usted.** Estos proyectos definen su primer mes de gestión: decidir si continúan, se reprograman o se revisan requiere el expediente, el contrato y el avance físico de cada uno, y en la seguridad ciudadana, el convenio de Obras por Impuestos.

4. Cómo cambian los ingresos

En el PIM 2026 pesan: canon y sobrecanon 54 %, FONCOMUN 22 %, operaciones de crédito 12 %, recursos directamente recaudados 6 %, impuestos municipales 4 %, recursos ordinarios 1 %, donaciones y transferencias 1 %. Los recursos propios son solo el 10 % del PIM. Lo que entró de enero a octubre de cada año (sin saldos de balance):

- **Canon y sobrecanon:** S/ 6.3 M, 23 % menos que en 2025 y 41 % menos que en 2023. Es la principal fuente de la municipalidad y la que más cae.
- **Ingresos propios:** S/ 1.4 M, 25 % menos que en 2025. Predial: S/ 0.5 M (2025: S/ 0.7 M).
- **FONCOMUN:** S/ 5.0 M, 30 % más que en 2025; compensa solo en parte la caída del canon.

Las operaciones de crédito suman S/ 3.3 M de PIM, todo CIPRL de Obras por Impuestos para la seguridad ciudadana local, sin devengado al corte.

Saldo de balance (clasificador 1.9.1.1.1.1): en 2026 se presupuestaron S/ 3.2 M y al corte figuran registrados S/ 0.3 M, diferencia que debe aclarar Tesorería. En 2024 se registraron S/ 8.3 M y en 2025, S/ 2.7 M: desde 2025 la municipalidad trabaja con reservas de años anteriores mucho menores (diferencias entre lo presupuestado y lo registrado, con valores sin redondear: 2023: S/ 1.0 M; 2024: S/ 0.9 M; 2025: S/ 0.0 M). Cuánto hay en las cuentas solo lo dicen los saldos bancarios.

> **Qué significa para usted.** El canon, su principal ingreso, viene cayendo y además paga los CIPRL. No asuma gasto permanente contando con que se recupere, y verifique que las previsiones financiadas con canon usen su proyección real.

5. Escenarios de cierre 2026

ESCENARIO	EJECUCIÓN AL CIERRE	SIN DEVENGAR
Menor ejecución	49.7 %	S/ 13.9 M
Central	**61.5 %**	**S/ 10.6 M**
Mayor ejecución	78.5 %	S/ 5.9 M

Cómo se calcula cada escenario: ver el anexo al final.

Si noviembre y diciembre se parecen a 2023–2025, el año cerraría en **61.5 %** y quedarían **S/ 10.6 millones** sin devengar, casi el doble del promedio de esos años (S/ 6.1 millones); el rango de referencia va de 49.7 % a 78.5 %. Son escenarios, no pronósticos, y suponen que el PIM no cambia. Para gastar todo el PIM harían falta S/ 8.5 M por mes, frente a un promedio mensual de S/ 1.3 M en el año.

Prueba con años pasados. Con el mismo método y datos a fin de octubre, el central habría dado 78.2 % para 2024 (real: 81.5 %) y 95.5 % para 2025 (real: 89.5 %): desviaciones de 3.3 y 6.0 puntos; el real quedó fuera del rango en 1 de 2 casos. Los escenarios son referencias, no límites.

¿Saldo real o presupuesto sin sincerar? Al ritmo de los años anteriores, unos **S/ 5.4 M** de ingresos del PIM 2026 no llegarían este año (51 % del saldo del escenario central), sobre todo canon y sobrecanon (PIM S/ 11.9 M frente a unos S/ 7.5 M esperados). Esa parte no sería dinero sin gastar sino presupuesto no sincerado (hipótesis que confirma Presupuesto). Además, S/ 2.9 M de saldo de balance presupuestado aún no figuran como ingreso registrado. La Ley 32732 autorizó a reducir el PIM con las estimaciones de ingresos que el MEF publicó en julio y octubre de 2026: conviene revisar el nivel actual del PIM y presupuestar 2027 con esas estimaciones.

> **Qué significa para usted.** En el escenario central quedarían unos S/ 10.6 millones sin devengar. Parte podría volver en 2027 como saldo de balance, pero solo si el dinero está en las cuentas: confírmelo con Tesorería.

6. Deuda y margen para pagar

AÑO	DEUDA TOTAL	FRENTE AL LÍMITE	INGRESO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	AHORRO EN CTA. CTE.
2023	S/ 4.5 M	13 %	S/ 20.4 M	S/ 13.2 M	S/ 7.2 M
2024	S/ 3.1 M	8 %	S/ 20.2 M	S/ 12.5 M	S/ 7.7 M
2025	S/ 17.7 M	52 %	S/ 16.8 M	S/ 11.9 M	S/ 4.9 M
2026*	S/ 18.4 M	58 %	S/ 5.0 M	S/ 5.7 M	S/ -0.7 M

Fuente: MEF, informes de reglas fiscales de gobiernos locales (evaluación anual 2023–2025; 2026* = seguimiento 2T2026). La deuda total no incluye beneficios sociales, pensiones ni juicios.

Según los informes anuales del MEF, la municipalidad cumplió las dos reglas fiscales en 2023, 2024 y 2025. La deuda total, sin embargo, saltó de S/ 3.1 millones en 2024 a S/ 17.7 millones en 2025, 52 % de sus ingresos corrientes promedio (el límite es 100 %). El registro de la DGTP al 31/05/2026 muestra S/ 13.9 M en dos créditos del MEF por CIPRL de Obras por Impuestos, por vencer y sin atraso, que se pagan con descuentos sobre el canon y otros recursos determinados; eso explicaría la mayor parte del salto (hipótesis: las fechas de corte no coinciden). En el seguimiento del segundo trimestre de 2026 (pasivos a marzo) la deuda llega a S/ 18.4 millones (58 %) y la regla de ahorro aparece incumplida: el gasto corriente superó al ingreso corriente (–S/ 0.7 millones). El resultado anual se conocerá con la evaluación de 2026. Mientras tanto, el ingreso corriente bajó de S/ 20.4 millones en 2023 a S/ 16.8 millones en 2025.

> **Qué significa para usted.** Cumple la regla de deuda, pero la mayor parte de su deuda son CIPRL que se descuentan del canon, y en el primer semestre de 2026 gastó en lo corriente más de lo que ingresó. Deje constancia en el acta de lo que recibe y pida el cronograma de descuentos.

7. El condicionante de las lluvias

Hay que separar cuatro cosas. El **fenómeno**: el ENFEN (comunicado N.° 19-2026, 30/10/2026) prevé un Niño costero de magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, medido por la temperatura del mar. Las **lluvias**: se pronostican sobre lo normal en la costa norte, sin un pronóstico específico para el distrito. La **emergencia**: Aguas Verdes ha estado en 2026 bajo declaratorias por lluvias encadenadas, desde la de enero (D.S. N.° 005-2026-PCM) hasta el D.S. N.° 149-2026-PCM (03/11/2026, 60 días, nivel 4), que la incluye en su anexo y vence alrededor del 1 de enero de 2027 si el plazo corre desde su publicación. Los **daños**: el 1 y 2 de noviembre el río Zarumilla se desbordó, se inundó el A.H. Puerto Perú y se instalaron albergues. La actividad de emergencia (5006144) tiene S/ 1.2 M de PIM en 2026, todo con canon, y lleva S/ 0.9 M devengados, la mayor parte registrada en abril; quedan S/ 0.3 M para el resto del año, salvo que se amplíe. La preparación sin esa actividad tiene S/ 0.1 M y los kits de ayuda humanitaria, nada.

> **Qué significa para usted.** Llegará con la temporada de lluvias en curso y con el distrito en emergencia. Sin declaratoria vigente, daños registrados en el SINPAD y la actividad de emergencia en el PIA 2027, no podrá pagar la respuesta con rapidez.

8. Lo que estos datos no permiten saber y qué pedir

SEÑAL EN LOS DATOS	QUÉ PEDIR (RESPONSABLE PROPUESTO)	PRODUCTO VERIFICABLE
Saldo no devengado y saldo de balance	Saldos bancarios por fuente y conciliaciones (Tesorería y Contabilidad)	Conciliación al 31/12/2026
Proyectos con bajo avance financiero	Avance físico, valorizaciones y estado contractual (Obras)	Ficha por CUI con avance físico
Certificado no comprometido (S/ 5.1 M)	Estado de cada certificación (Abastecimiento)	Relación de certificaciones con su situación
Obras por Impuestos de la seguridad ciudadana	Convenio, empresa, plazo, avance y CIPRL emitidos (Gerencia Municipal y Presupuesto)	Expediente del convenio
Deuda de S/ 17.7 M, de la que S/ 13.9 M son CIPRL	Estados financieros con notas; composición de la deuda usada en la regla fiscal; cronograma de descuentos de los CIPRL (Contabilidad, Presupuesto, DGTP)	Inventario de obligaciones con acreedor, monto y vencimiento
Contingencias	Sentencias en ejecución, beneficios sociales y pensiones (Procuraduría y RR. HH.)	Relación con montos y fechas
Emergencia por lluvias	Decretos vigentes y su anexo, plan ante lluvias, daños de noviembre registrados en el SINPAD y requisitos FONDES (Gestión del Riesgo)	Vigencia confirmada; plan aprobado
Presupuesto 2027	PIA 2027 aprobado frente al PIA 2026 (S/ 22.3 M) y previsiones presupuestarias emitidas: CUI, monto y fuente (Presupuesto)	PIA 2027 por fuente y genérica; relación de previsiones

Anexo. Cómo se calcularon los escenarios de cierre 2026

MÉTODO (LOS 1 A 4 SE PROMEDIAN)	VALOR APLICADO	RESULTADO
1. Factor de cierre	×1.205 (promedio de ×1.262, ×1.277, ×1.075) sobre S/ 13.4 M	S/ 16.1 M
2. Gasto nov–dic como % del PIM	12.8 % × S/ 27.6 M	S/ 16.9 M
3. Gasto nov–dic como % de lo que faltaba	39.3 % × (PIM – devengado)	S/ 19.0 M
4. Ritmo de los tres últimos meses	S/ 1.3 M × 2	S/ 16.0 M
Escenario central	promedio de 1 a 4: 61.5 % del PIM	**S/ 17.0 M**
Rango de referencia	central -22.9 % / +32.8 % de lo que falta devengar: 49.7 % / 78.5 %	S/ 13.7 M / S/ 21.7 M

Cómo se calculó. Devengado ÷ PIM con el PIM vigente (2026) o final (años cerrados); referencia lineal = días transcurridos ÷ 365. El promedio de cuatro métodos se adoptó porque, aplicado a unas 1 900 municipalidades en 2024 y 2025, se equivocó menos que el anterior; el rango usa los percentiles 10 y 90 de esos errores. Este informe no reemplaza la auditoría ni el informe de transferencia.

ELABORADO POR
Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.

PLATAFORMA DE ANÁLISIS
KRONOS Gestión de Datos

Panta Quiroga Corporativo E.I.R.L.
997 817 252
PantaquirogaIA2030@gmail.com

Escanee para escribir por WhatsApp
